



Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2021



Indhold

Sammenfatning	1
1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden	2
2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden	3
2.1. Bevægelser i 2021.....	3
2.2. Udvikling de sidste 10 år.....	4
2.3. Projektstatus.....	5
3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden	6
3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti.....	6
4. Økonomien for udvalgte projekter.....	9
4.1. Nye projekter i 2021	9
4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.	10
4.3 Status for de 25 største projekter	11
Bilag	14
Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti	14
Bilag 2: Projektstatus	32
Bilag 3: Lovgrundlag for Anlægs- og Renoveringsfonden.....	48

Sammenfatning

Denne redegørelse for finanslovsåret 2021 er nr. 22 i rækken af redegørelser om bevægelserne i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Primo 2021 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.078 mio. kr. I 2021 blev der bevilget samlet 497 mio. kr. og samlet forbrug var 557 mio. kr.

Ultimo 2021 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.017 mio. kr., hvilket var en reducereing af Anlægs- og Renoveringsfonden med 61 mio. kr. fra primo samme år.

Ovenstående tal er eksklusivt udlån på nedenstående hovedkonti, og kan derfor ikke afstemmes med Landskassens regnskab.

- 20.30.07 – Boligstøtte, renter og afdrag, netto
- 87.72.17 – Boligstøtte, selvbyggerhuse
- 87.72.23 – Boligstøtte, istandsættelsestilsbud
- 89.72.11 – Støttet privat boligbyggeri

Se tabel 2.1 for en opgørelse der kan afstemmes med Landskassens regnskab.

1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden

Formålet med oprettelsen af Anlægs- og Renoveringsfonden var at smidiggøre procedurerne omkring bevilling af midler til Selvstyrets bygge- og anlægsopgaver.

Selvstyret afsætter hvert år et beløb til anlægs- og renoveringsopgaver i Finansloven, den såkaldte anlægsramme. Anlægsrammen er sektorfordelt, hvor der inden for hver sektor foretages prioritering af konkrete bygge- og anlægsopgaver.

Med det formål at effektivisere og optimere gennemførelsen af Selvstyrets bygge- og anlægsopgaver, er bygherrefunktionen centraliseret medio 2021, hvor funktionen herefter er varetaget af Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Den centrale bygherrefunktion er opdelt i to operative enheder, således at den overordnede planlægning og prioritering af opgaverne, budget- og økonomistyring samt bygherreadministrationen af nybyggeri varetages af Departementet for Boliger og Infrastruktur, mens renoverings-, vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver varetages fra den til formålet oprettet underliggende styrelse (Renoveringsstyrelsen).

Anlægs- og Renoveringsfonden er en budgetteknisk fond¹, der ikke kan søges midler fra. De midler, der er registreret i fonden, sker ved vedtagelse af den årlige Finanslov samt Tillægsbevillingslov, og disse er bundet til konkrete projekter. Skal der rokeres midler fra fonden eller projekter imellem, skal dette ske ved at aflyse eller ændre et givent projekt, hvilket kræver politisk godkendelse af Inatsisartut eller Inatsisartuts Finans – og Skatteudvalg.

¹ Se bilag 3 Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, kapitel 4 om finanslovs, årsbudget mv., §14-17 om anlæg, renovering mv.

2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden

2.1. Bevægelser i 2021

Tallene i nærværende redegørelse er baseret på udtræk fra Selvstyrets økonomisystemer og er identiske med de tal der registreres i Landskassens regnskab. Tabel 2.1 viser opgørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden i 2021 hvor "Total for A&R fonden" kan afstemmes direkte med landskassens regnskab.

Tabel 2.1 - Opgørelse af A&R fonden 2021 (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	Primo 2021	Bevilling 2021	Forbrug 2021	Ændring 2021	Ultimo 2021
Projekter	-1.078.683	-496.775	557.281	60.506	-1.018.177
Periodisering	95	0	-187	-187	-92
Regulering fra lukkede projekter	566	812.956	-812.256	700	1.266
Total for redegørelsen	-1.078.022	316.181	-255.162	61.019	-1.017.003
Hovedkonto 20.30.07	-8.919	-84	-25	-109	-9.028
Hovedkonto 87.72.17	-7	0	0	0	-7
Hovedkonto 87.72.23	-10.142	0	-709	-709	-10.851
Hovedkonto 89.72.11	13.644	23.559	-87	23.472	37.116
I alt	-1.083.446	339.657	-255.983	83.674	-999.773

Redegørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden (A&R fonden) dækker fra 2010 ikke *hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri*. Fra 2016 dækker redegørelsen heller ikke *hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto*. Fra 2019 dækker redegørelsen endvidere ikke *hovedkonto 87.72.17 Boligstøtte, selvbyggerhuse* og *hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud*. Disse konti er derfor kun medtaget for at kunne afstemmes med landskassens regnskab. Alle disse konti omfatter udlånsager.

Primo 2021 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.078 mio. kr. eksklusiv de fire nævnte hovedkonti.


I 2021 blev der bevilget samlet 497 mio. kr. og samlet forbrug var 557 mio. kr.

Ultimo 2021 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning dermed 1.017 mio. kr., hvilket var en reducere af fonden med samlet 61 mio. kr.


2.2. Udvikling de sidste 10 år

Bevillingerne i 2021 udgjorde samlet 497 mio. kr., mens forbruget udgjorde samlet 557 mio. kr. Det har medført en reducereing af Anlægs- og Renoveringsfonden på samlet 61 mio. kr.

Den historiske udvikling kan aflæses af de nedenstående figurer.

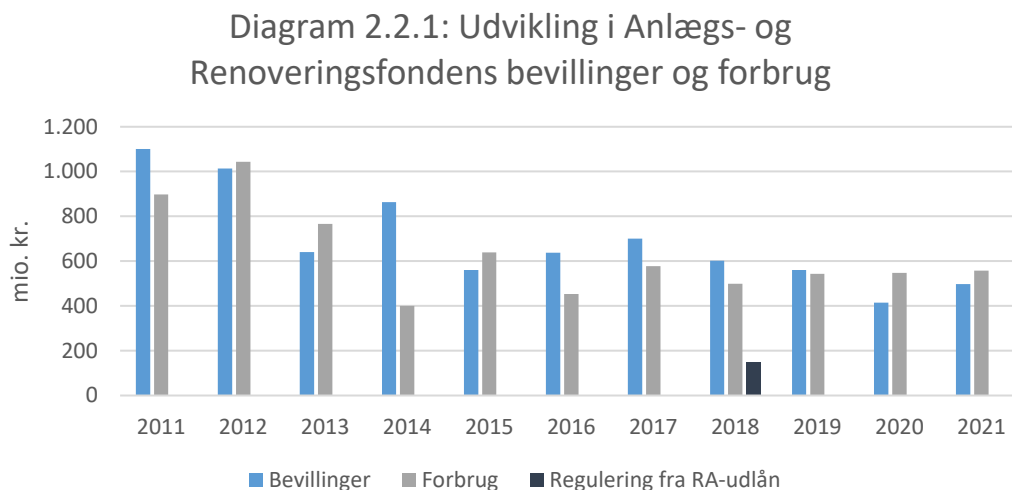

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

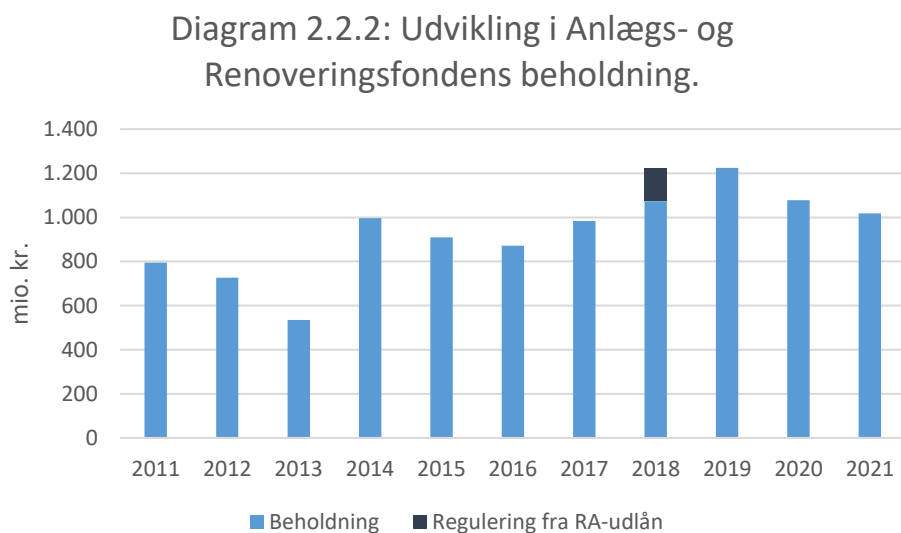

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

Alle tal er opgjort eksklusiv hovedkonto 20.30.07, 89.72.11, 87.72.17 og 87.72.23 og kan derfor ikke direkte sammenlignes med landskassens regnskab.

2.3. Projektstatus

I 2021 var der 11 nye projekter, 161 projekter er videreført fra tidligere år, mens der var 23 passive projekter. I alt var der 195 åbne projekter ultimo 2021.

Projekternes status beskrevet i tabel 2.3 herunder. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 2.3: Projektstatus

Projektstatus	Antal projekter
Videreførte projekter	161
Passive projekter	23
<i>Projekter under afslutning i 2021</i>	<i>50</i>
Åbne projekter primo	234
Nye projekter i 2021	11
<i>Projekter under afslutning i 2021</i>	<i>50</i>
Åbne projekter ultimo	195
Øvrige projekter under afslutning	0
<i>Projekter under afslutning i 2021</i>	<i>50</i>
Projekter i alt	245

3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden

3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti

De fem største hovedkonti (målt i disponible midler) var 83.30.13 Landsdækkende institutioner, 89.72.12 Boligprojekter og erstatningsbyggeri, 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg, 86.60.01 Sundhedsvæsenet og 84.40.15 Kollegiebyggeri. Se yderligere detaljer i bilag 1.

Kolonnen 'Rest til disponering' i tabel 3.1, angiver den del af projektets bevilling, der endnu ikke er indgået kontrakter på pr. 31-12-2021. Hertil skal det fremgå, at bevillingsstørrelsen tager udgangspunkt i projekternes budget, hvor løbende udgifter, herunder uforudsete udgifter, administrationsomkostninger, rejseudlæg osv. inkluderes. Der disponeres til disse udgifter såfremt og når det bliver aktuelt. 'Rest til disponering' er således ikke lige med at der er ledige midler der kan rokeres til andre formål.

Tabel 3.1: Fordeling af projekter på hovedkonti (i 1.000 kr.).

Hovedkonto	Projekter	Primo 2021	Bevilling 2021	Disponibel 2021	Forbrug 2021	Ultimo 2021	Forbrug i %	Rest til disponering
011014 Reserve til ny Landstingssal	2	1.414	0	1.414	0	1.414		1.047
011015 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut	1	1.936	0	1.936	0	1.936		1.714
758620 Miljø, anlæg	1	0	0	0	0	0		
800001 Omrokeringsreserven	1	0	9.800	9.800	0	9.800	0%	9.800
800010 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	1	2.513	0	2.513	0	2.513		0
800080 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer	1	3.000	-3.000	0	0	0	0%	0
811002 Renovering og ombygning Selvstyrets centrale administration	2	0	1.300	1.300	0	1.300	0%	1.300
812002 Indretning af serverrum	1	0	0	0	0	0		
822002 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	1	4.030	1.000	5.030	-19.379	-14.349	-1938%	21.129
822003 IT-systemer til socialområdet	1	11.000		11.000	-114	10.886		10.886
822401 Administrative systemer mv. i Skattestyrelsen	2	3.600	1.800	5.400	-3.471	1.929	-193%	1.929
822402 Nyt IT-system	1	0	0	0	0	0		-1.975
833012 Ældreinstitutioner	10	33.149	15.800	48.949	-14.209	34.740	-90%	-21.879
833013 Landsdækkende institutioner	21	98.481	20.800	119.281	-30.726	88.557	-148%	76.327

Hovedkonto	Projekter	Primo 2021	Bevilling 2021	Disponibel 2021	Forbrug 2021	Ultimo 2021	Forbrug i %	Rest til disponering
844009 Erhvervsuddannelses området	2	-209	-52.200	-52.409	52.200	-209	-100%	-51.833
844010 Kommunale skoler	14	-3.647	-13.950	-17.597	13.950	-3.647	-100%	-126.092
844012 Uddannelsesbyggeri	11	10.557	-4.133	6.424	2.396	8.821	-58%	1.971
844014 Kultur- og idrætsbyggeri	1	2.217	3.500	5.717	-122	5.595	-3%	5.164
844015 Kollegiebyggeri	18	264.441	59.200	323.641	-107.462	216.180	-182%	-179.188
844016 Kulturbyggeri	2	-250	0	-250	0	-250		-583
844017 Institutioner for børn og unge	2	185	0	185	-176	9		-2
844018 Øvrige skolebygninger	2	0	475	475	-427	48	-90%	48
844501 Kirken	2	102	0	102	0	102		12
855020 Turismeanlæg	4	15.400	5.000	20.400	-5.000	15.400	-100%	20.400
866001 Sundhedsvæsenet	28	142.440	11.213	153.653	45.076	198.730	402%	-31.634
870088 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter	3	6.821	0	6.821	-502	6.319		-5.270
871106 5-års eftersyn	5	524	500	1.024	-214	810	-43%	999
871109 Transportkommissionen - forundersøgelser	0	38.196	-5.000	33.196	-2.290	30.908	46%	28.290
877002 Køb af administrationsbygning	0	0	-27.070	-27.070	27.070	0	-100%	-27.070
877003 Vestnorden Foresight 2030 - bygdernes fremtidsvisioner	1	0	0	0	0	0		0
877208 Reinvst. hjem. Udlejningsboliger	1	0	0	0	0	0		0
877210 Personaleboliger i Nuuk	1	9.650	3.500	13.150	-20	13.130	-1%	8.901
877213 (tom)	2	78	-31.223	-31.145	31.224	79	-100%	-29.002
877221 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri	2	-1.556	-81.086	-82.642	81.087	-1.555	-100%	-82.642
877222 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	6	2.640	0	2.640	0	2.640		-20.011
877225 Sanering af udlejningsboliger mm	1	0	0	0	0	0		0
877310 Havneanlæg	2	4.780	0	4.780	0	0		2.035

Hovedkonto	Projekter	Primo 2021	Bevilling 2021	Disponibel 2021	Forbrug 2021	Ultimo 2021	Forbrug i %	Rest til disponering
877312 Reinvestering i havne og kaj anlæg	7	27.935	45.200	73.135	-19.938	53.198	-44%	42.391
877320 Udbygning af landingsbanestruktur	6	11.384	-10.000	1.384	-73	1.311	1%	1.288
877322 GLV - landingspladser	9	25.137	15.015	40.152	-4.138	36.015	-28%	-33.243
877501 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	1	41.833	0	41.833	-44.073	-2.239		96.461
877502 Miljøafbødende foranstaltninger på Dundas	0	1	13.742	13.743	-13.743	0	-100%	13.743
877503 Tilskud til kommunale miljø anlæg	1	2.438	0	2.438	0	2.438		95
897140 Nukissiorfiit, anlægsudlån	1	0	-163.900	-163.900	163.900	0	-100%	-43.900
897141 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning	1	0	-95.400	-95.400	95.400	0	-100%	0
897212 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	63	317.884	-37.064	280.820	8.742	289.565	-24%	-314.679
Afrunding	0	13	0	0	7	7	0	0
Periodisering	0	-95	0	0	187	92	0	0
Hovedtotal	245	1.078.022	-316.181	761.923	255.162	1.017.003		-623.073

4. Økonomien for udvalgte projekter

4.1. Nye projekter i 2021

Der blev registreret 11 nye projekter i 2021. Projekternes bevillinger udgjorde i alt 135 mio. kr., svarende til ca. 27% af de samlede anlægsbevillinger i 2021. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Table 4.1: Nye projekter i 2021 (i 1.000 kr.)

Finanslov	Projekt	Projektitel	Bevillinger 2021	Forbrug 2021
800001	80800	Omrokeringsreserve	9.800	
811002	10054	Selvstyrets Central Administration	1.300	
822002	90028	Administrative systemer mv. i Skattestyrelsen	1.000	
844018	50148	Køb af hus til Ado Lyngep Atuarfia	475	-427
866001	46034	Anskaffelser af ambulancer	5.000	-448
866001	47042	Regionssygehus i Sisimiut	2.400	-8
866001	47060	Nyt operationsafsnit, Sisimiut	2.550	-5.170
871106	73016	5-års eftersyn	500	-200
877322	25214	Hangar til Tasiilaq	29.300	-7.432
897140	17778	Udlån til Nukissiorfiit, 2021	60.000	-60.000
897212	39043	Opførelse af boliger, Qaarsut	23.100	-9.365
Hovedtotal			135.425	-83.050

4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.

Der var 17 åbne projekter med en bevilling t.o.m. 2021 på over 50 mio. kr. i 2021. Se yderligere detaljer i bilag 1-2.

Tabel 4.2: Åbne projekter over 50 mio. kr. (i 1.000 kr.).

Projektnr.	Projekttitel	Hovedkonto	Bevilling t.o.m ultimo 2021	Total forbrug ultimo 2021
34527	Diverse renovering og sanering	897212	314.055	-229.693
61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	220.000	-222.239
24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	169.869	-154.253
47055	Diverse nyanlæg og renovering	866001	134.100	-146
52114	219 sengepladser, Nuuk	844015	131.500	-40.183
47053	Vedligeholdelsesefterslæb	866001	107.000	-93.401
47051	Apparaturpuljen	866001	103.100	-77.404
31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	82.400	-80.511
39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554	-110.366
30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	79.710	-75.664
23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	77.153	-46.759
90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	75.942	-90.713
32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	877221	69.800	-71.356
40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	65.020	-52.484
52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	64.250	-14.628
31037	Skimmel renovering	897212	53.700	-50.527
52115	74 sengepladser, Qaqortoq	844015	51.850	-40.342
Hovedtotal			1.881.003	-1.450.669

4.3 Status for de 25 største projekter

Nedenfor fremgår status for de 25 største projekter målt på den bevilling t.o.m. ultimo 2021. Her er der tale om projekter, som endnu ikke er sendt til intern revision.

Projektnr.	Projekttitle	Finanslov	Bevilling t.o.m. ultimo 2021	Total forbrug ultimo 2021	Status
34527	Diverse renovering og sanering	897212	314.055	-229.693	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
*61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	220.000	-222.239	Sidste ratebetaling er udbetalt til en deponeringskonto hos en advokat, grundet forsinkelser i aflevering af skibet. Der pågår fortsat mangeludbedring, hvorfor skibet bliver endelig afleveret i starten af 2022. Projektet bliver herefter lukket..
24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	169.869	-154.253	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
47055	Diverse nyanlæg og renovering	866001	134.100	-146	Projektet er en puljebevilling til udmøntning til udførelse efter endt licitation – i henhold til det 2-delte bevillingsprincip. Udmøntes løbende og i henhold til afholdte og tilfredsstillende licitationer. Vil blive benyttet til udmøntning til psykiatribygning og renovering/ombygning af Sisimiut sygehus i 2022.
52114	219 sengepladser, Nuuk	844015	131.500	-40.183	Opførelse af kollegier i Nuuk er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
47053	Vedligeholdelsesefterslæb	866001	107.000	-93.401	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
47051	Apparaturpuljen	866001	103.100	-77.404	Projektet er en puljebevilling til indkøb af apparatur til sundhedsvæsenet. Herunder indkøb for såvel fornyelse, udvidelse, reparation og vedligehold.
31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	82.400	-80.511	Opgaven er udført, hvor der under 1 års eftersynsperiode er konstateret mangler – mangeludbedring pågår. Projektet afsluttes og lukkes i 2022.
39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554	-110.366	Opgaven er udført, og 1 års eftersynsperiode + mangeludbedring heraf er gennemført i efteråret 2021. Udarbejdelse og afklaring af

					byggeregnskab pågår, afsluttes og lukkes i 2022. Forinden lukning, skal der gennemføres rokering af midler der er modtaget fra Staten ifb. med tsunamien. Projektets bevilling vil herefter stemme med forbruget.
30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	79.710	-75.664	Blok 3 er under udførelse, og Blok 1 & 2 er under 1 års eftersynsperiode.
23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	77.153	-46.759	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – herunder særligt rådgivningsopgaver i forbindelse med udbygning af landets infrastruktur.
**90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	75.942	-90.713	Der er tale om PRISME indkøb og implementering, der er løbet fuldstændig af sporet, jf. forbrug vs. Bevilling.
46017	Patienthotel, Nuuk	866001	66.522	-66.549	Forlig om udestående i forbindelse med 5 års gennemgang indgået primo 2021. Er under lukning.
40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikingut	833013	65.020	-52.484	Der er gennemført aflevering med mindre mangler i december 2021, og der pågår 1 års eftersynsperiode, som først afslutter i januar 2023. Lukkes i 2023.
52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	64.250	-14.628	Opførelse af kollegier i Sisimiut er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
31037	Skimmel renovering	897212	53.700	-50.527	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af 'smilende boliger' konceptet (totalrenovering) i Selvstyrets boliger der står i tomgang pga. skimmel. Opgaverne udbydes løbende i underhåndbud, for at imødekomme behov for beskæftigelse i branchen. Der er udbudt færre opgaver i 2021 end forventet, pga. mangel på kapacitet. Tillige kan der afholdes over bevillingen tilskud til INI A/S for udbedring af mindre skimmelsopgaver.
47031	Udbygning DIH - fondsmidler	866001	53.428	-53.564	Forlig om udestående i forbindelse med udførelse er indgået primo 2021. Udarbejdelse af byggeregnskab er forsinket pga. omfang, hvorfor projektet lukkes først i 2022.
52115	74 sengepladser, Qaqortoq	844015	51.850	-40.342	Opførelse af kollegier i Qaqortoq er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
31066	Fornyelse af installationer i flere byer	897212	45.200	-9.551	Opgaven er opstartet i 2021, med en del forsinkelser primært pga. COVID-19 pandemien (forsinket levering af materiale + udfordringer med indrejse af kursister). Der er afholdt kursus for VVS'ere i Nuuk, som efterfølgende er startet på relining af rør i Selvstyrets flerfamiliehuse. Udførelse har haft en del opstartsudfordringer, herunder bl.a. manglende kapacitet pga. coronasmitte, strømsvigt, skader på rør, som er løst

					løbende. Fortsætter i Nuuk + uddannelse samt udførelse i øvrige byer i 2022.
52112	70 sengepladser, Ilulissat	844015	44.600	-11.401	Opførelse af kollegier i Ilulissat er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
52111	32 sengepladser, Aasiaat	844015	41.800	-12.032	Opførelse af kollegier i Aasiaat er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
25183	Langsigtede investeringsbehov	877322	40.000	-30.469	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af opgaver – herunder særligt akutte opgaver som følge af hidtil manglende investering i landets lufthavne – baner/asfalt, bygninger, rullende materiel.
52095	Skolepraktikhaller og haller til ko	844012	36.500	-35.564	Opførelse af hal til KTI i Sisimiut er udført, og er under 1 års eftersynsperiode. Lukkes i 2022.
40091	Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og reovering	833013	34.500	-3.609	Opgaven er udbudt i 2021, og der er indgået kontrakt i december. Opstart er i januar 2022, med aflevering ultimo 2023.
24131	Havnefaciliteter i Uummanaq	877312	34.100	-29.657	Der er gennemført aflevering med mindre mangler i oktober 2021, og der pågår 1 års eftersynsperiode. Lukkes i 2022/2023.
Hovedtotal			2.207.853	-1.631.709	

* Tabellen viser et overforbrug på projekt 61.004 Nyt skib til Pinngortitaleriffik, på samlet 2,2 mio. kr. Omkostninger til byggeri af skibet er samlet 235 mio. kr., hvoraf Landskassens bevilling udgør 220 mio. kr. og hvor de resterende 15 mio. kr. er fondsmidler, som først indbetales når skibet er afleveret til Selvstyret. Der er således ikke tale om et reelt overforbrug i forhold til de samlede omkostninger.

** Tabellen viser et overforbrug på projekt 90.022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP, på samlet 14,8 mio. kr. Dette skyldes fejl i konverteringer fra Selvstyrets gamle ERP system til det nye, som først er identificeret ved udarbejdelsen af redegørelsen for 2021, og som først er muligt at rette i løbet af 2022.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti

Finanslov	Projekt	Projektitel	Primo forrige år	Bevilling IÅ	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug total	Disponering	Disponeret vs forbrug	Rest disponering
11014	10019	Udvidelse af Landstingssal	-75		-75		-75	3.379	-3.454	-3.455	0	-76
11014	10053	Ny bygning til Inatsisatut	1.489		1.489		1.489	3.000	-1.511	-1.877	-366	1.123
11014 Total			1.414		1.414		1.414	6.379	-4.965	-5.332	-366	1.047
11015	10049	22 mindre boliger til Inatsisartut	1.936		1.936		1.936	6.000	-4.064	-4.286	-222	1.714
11015 Total			1.936		1.936		1.936	6.000	-4.064	-4.286	-222	1.714
758620	14001	Indkøb af olieberedskab	0		0		0		0		0	
758620 Total			0		0		0		0		0	
800001	80800	Omrokeringsreserve	0	9.800	9.800		9.800	9.800				9.800
800001 Total			0	9.800	9.800		9.800	9.800				9.800
800010	80801	Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	2.513	0	2.513		2.513	0	2.513		-2.513	0
800010 Total			2.513	0	2.513		2.513	0	2.513		-2.513	0
800080	80802	Disp. til påpg.projekteringer	3.000	-3.000	0		0	0				0
800080 Total			3.000	-3.000	0		0	0				0
811002	10054	Selvstyrets Central Administration		1.300	1.300		1.300	1.300				1.300
811002 Total				1.300	1.300		1.300	1.300				1.300
812002	10047	Indkøb af IT-server udstyr samt tilhr. el/IT	0		0		0		0		0	
812002 Total			0		0		0		0		0	
813673	18303	TD:Ren. fj.varmeledningsnet	0		0		0		0		0	
813673 Total			0		0		0		0		0	

822002	90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	4.030		4.030	-19.379	-15.349	75.942	-90.713	-55.813	-34.900	20.129
822002	90028	Udvikling af ERP		1.000	1.000		1.000	1.000				1.000
822002 Total			4.030	1.000	5.030	-19.379	-14.349	76.942	-90.713	-55.813	-34.900	21.129
822003	40089	Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	11.000		11.000	-114	10.886	11.000	-114			10.886
822003 Total			11.000		11.000	-114	10.886	11.000	-114			10.886
822401	90020	Nyt IT-system	0		0		0		0		0	
822401	90024	Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	3.600	1.800	5.400	-2.087	3.313	5.400	-2.087	-2.087	0	3.313
822401	90025	Beskæftigelsesfradrag				-1.384	-1.384		-1.384	-1.384	0	-1.384
822401 Total			3.600	1.800	5.400	-3.471	1.929	5.400	-3.471	-3.471	0	1.929
822402	25192	Krops- og narkoskannere	0		0		0	0	0	-1.975	-1.975	-1.975
822402 Total			0		0		0	0	0	-1.975	-1.975	-1.975
833012	44029	Projektering alderdomshjem, Man.	0		0		0		0		0	
833012	44033	Plejhjem i Qaqortoq	0		0		0		0	-21.550	-21.550	-21.550
833012	44044	Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	1.742		1.742		1.742	13.575	-11.833	-13.581	-1.748	-6
833012	44047	Alderdomshjem i Paamiut	2.230		2.230		2.230	27.500	-25.270	-27.506	-2.236	-6
833012	44048	Pulje til nyanlæg og renovering	3.300	4.400	7.700		7.700	7.700				7.700
833012	44049	Tilstandsregistrering af ældreområdet	-63		-63		-63	3.600	-3.663	-3.832	-169	-232
833012	44051	Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	-1.063	11.400	10.337	-3.817	6.520	16.350	-12.347	-23.663	-11.316	-7.313
833012	44053	Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	17.994		17.994	-4.790	13.204	18.000	-4.796	-18.006	-13.210	-6
833012	44054	Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	9.009		9.009	-5.142	3.867	16.400	-12.533	-16.406	-3.873	-6

833012	44056	Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut				-460	-460		-460	-460	0	-460
833012 Total			33.149	15.800	48.949	-14.209	34.740	103.125	-70.902	-125.004	-54.102	-21.879
833013	40031	Handicapsatellit, pilotprojekt	0		0		0		0		0	
833013	40036	Familiebehandlingsafdeling/B&U, Umq	0		0		0		0		0	
833013	40044	Boliger til autister, Qaqortoq	0		0		0		0		0	
833013	40047	Etabl. af et udslusningshjem f. unge mel. 18-23	0		0		0		0	-75	-75	-75
833013	40054	Landsdækkende handicap træningscenter	1.237		1.237		1.237	56.269	-55.032	-58.063	-3.030	-1.794
833013	40058	Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	247		247	-106	141	7.600	-7.459	-7.412	47	188
833013	40062	Udredningshjem	874	6.000	6.874	-745	6.129	14.400	-8.271	-8.589	-318	5.811
833013	40063	Misbrugsbehandlingshjem	2		2		2	20	-18	-100	-82	-80
833013	40064	Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	35		35	-98	-63	3.300	-3.363	-3.393	-30	-93
833013	40066	Opdeling af Aaqa i to institutioner	1.989		1.989	-10	1.979	2.000	-21	-11	10	1.989
833013	40067	Pulje til nyanlæg og renovering	54.089	-31.600	22.489	-23	22.467	22.520	-53	-31	23	22.489
833013	40068	Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	277		277		277	2.500	-2.223	-2.225	-2	275
833013	40075	Lukket gårdmiljø til Isikkivik	818		818		818	830	-12	-12	0	818
833013	40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	15.035	20.800	35.835	-23.298	12.536	65.020	-52.484	-53.631	-1.147	11.389
833013	40081	Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	-12		-12		-12	40	-52	-52	0	-12
833013	40084	Genopførelse af udslusningshjem,	6.601		6.601	-1.567	5.035	5.315	-280	-6.357	-6.078	-1.042

		Uumannaq										
833013	40085	Genopretning af brandskade, Uumannaq	-1.534		-1.534	1.534	0		0	0	0	0
833013	40086	Døgninstitution for børn med sindslidelser	5.968		5.968	-538	5.430	6.000	-570	-732	-162	5.268
833013	40087	Institution for børn og voksne med multihandicap	6.000	-6.000	0		0	0				0
833013	40090	Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	251	4.000	4.251	-2.561	1.690	7.000	-5.267	-6.570	-1.303	430
833013	40091	Najugaqarfik Elisibannuaq-nybyg og renovering	6.604	27.600	34.204	-3.314	30.891	34.500	-3.609	-3.734	-125	30.766
833013	Total		98.481	20.800	119.281	-30.726	88.557	227.314	-138.714	-150.987	-12.272	76.327
844009	51010	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	0	-52.200	-52.200	52.200	0	0	0	-52.200	-52.200	-52.200
844009	51013	Udvidelse INULLI, Narsaq	-209		-209		-209	61.400	-61.609	-61.033	576	367
844009	51017	Vandskade på PI-Center, Nuuk	0		0		0		0		0	
844009	51018	AMK tilbygning til Piareersarfik, Ilulissat	0		0		0		0		0	
844009	Total		-209	-52.200	-52.409	52.200	-209	61.400	-61.609	-113.233	-51.624	-51.833
844010	50069	Ren./ombyggn.udv. skole Qaqortoq	936		936		936	115.700	-114.764	-116.400	-1.636	-700
844010	50083	Skole i Kangersuatsiaq	0		0		0		0	-5.750	-5.750	-5.750
844010	50091	Skolen Aappilattoq	65		65		65	18.150	-18.085	-17.637	448	513
844010	50107	Ren./ombyggn. af skole, Nanortalik	0		0		0		0		0	
844010	50108	Ren./ombyggn. Ming. skolen, Sisimiut	0		0		0		0		0	
844010	50110	Skole, Narsaq	0		0		0		0	-72.485	-72.485	-72.485
844010	50111	Ren./ombyggn./udv. skole, Sarfannguit	514		514		514	9.500	-8.986	-9.517	-531	-17
844010	50115	Ren./ombyggn./udv. skole, Nuussuaq	770		770		770	9.800	-9.030	-9.032	-3	768

844010	50119	Ren./ombyggn./udv. skole, Itilleq	0		0		0		0		0	
844010	50126	Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	2.630		2.630		2.630	13.700	-11.070	-11.314	-244	2.386
844010	50128	Om- og tilbygning af Nalunnguarsiup Atuarfia, Sisi	0		0		0		0	-26.000	-26.000	-26.000
844010	50131	Ny skole i Ilulissat	202		202		202	192.655	-192.453	-195.266	-2.812	-2.611
844010	50132	Diverse skole, nyanlæg og renovering	-7.254		-7.254	0	-7.254	-1.050	-6.204	-6.178	25	-7.228
844010	50133	Bygdeskole, Alluitsup Paa	-1.510		-1.510		-1.510	27.850	-29.360	-29.818	-459	-1.968
844010	50143	Ren/ombyggn. af skolen, Kangaatsiaq	0	-13.950	-13.950	13.950	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
844010	Total		-3.647	-13.950	-17.597	13.950	-3.647	386.305	-389.952	-512.397	-122.447	-126.092
844012	51021	Projektplan for udflytning af udd. inst.	-329		-329	0	-329	2.500	-2.829	-3.076	-247	-576
844012	51024	Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	9.948		9.948	-518	9.430	10.000	-570	-888	-318	9.112
844012	51026	Landbrugsskole i Upernaviarsuk	2.946		2.946	-73	2.873	3.000	-131	-460	-329	2.540
844012	52043	Udbygning GU Nuuk, 2. etape	0		0		0		0		0	
844012	52061	Udvidelse af GU, Aasiaat	-183		-183		-183	89.400	-89.583	-89.583	0	-183
844012	52085	Renov. af udd. bygnigner Qeq. kommunia	-62		-62		-62	309	-371	-330	40	-21
844012	52086	Udvidelse af PISPS, Ilulissat	-815		-815		-815	44.344	-45.159	-45.157	2	-813
844012	52087	Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	470		470		470	104.400	-103.930	-104.385	-454	15
844012	52088	Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademii, Nuuk	-551		-551		-551	12.500	-13.051	-13.051	-1	-551
844012	52094	Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	-2.079		-2.079	-881	-2.959	19.691	-22.650	-22.537	113	-2.846
844012	52095	Skolepraktikhaller og haller til ko	1.212		1.212	-265	947	36.500	-35.564	-36.206	-642	294

844012	52099	Køb af fast ejendom til Vejlednings- psyk.- soc.råd	0	-4.133	-4.133	4.133	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
844012 Total			10.557	-4.133	6.424	2.396	8.821	322.644	-313.838	-320.673	-6.836	1.971
844014	54007	Tilskud til renovering af idrætshaller	2.218	3.500	5.718	-123	5.595	17.900	-12.305	-12.735	-430	5.165
844014	54008	Projektering af kunstgræsbaner, 2017	-1		-1	1	0		0	-1	-1	-1
844014 Total			2.217	3.500	5.717	-122	5.595	17.900	-12.305	-12.736	-431	5.164
844015	52060	Elevhjem i Nanortalik	0		0		0		0	-4.219	-4.219	-4.219
844015	52063	Projekt. og opf. af 42 kollegier Nuuk 2011	0		0		0		0		0	
844015	52064	Projektering og opf. af kollegier i Sisimiut 2011	0		0		0		0		0	
844015	52065	Projektering og opf. af kollegier i Aasiaat 2011	0		0		0		0		0	
844015	52066	Tilstandsregistrering af elevhjem og kollegier	0		0		0		0		0	
844015	52071	Skolehjem med 50 værelser , Uummanaq	-474		-474		-474	32.000	-32.474	-32.474	0	-474
844015	52077	Kollegiebyggeri i Kujalerpaat, Nuuk 1. etape	0		0		0		0	-12.162	-12.162	-12.162
844015	52091	Kollegiebyggeri i Paamiut	0		0		0		0	-15.571	-15.571	-15.571
844015	52092	Etablering/renovering elevhjem Qassiarsuk	6.224		6.224	-979	5.243	20.700	-15.516	-18.117	-2.600	2.583
844015	52101	Projektering af standardkollegier, 2015	-304		-304		-304	2.078	-2.382	-2.382	0	-304
844015	52102	Projektering af standardkollegier	133	3.000	3.133	-15	3.118	6.000	-2.882	-2.953	-71	3.047
844015	52103	Projektering af standardkollegier, 2017	14		14		14	2.100	-2.086	-2.127	-41	-27
844015	52104	Diverse kollegieprojekter	-10.559		-10.559		-10.559		-10.559	-10.559	0	-10.559

844015	52111	32 sengepladser, Aasiaat	31.089	10.000	41.089	-9.690	31.399	41.800	-12.032	-50.408	-38.376	-8.608
844015	52112	70 sengepladser, Ilulissat	33.933	10.000	43.933	-8.679	35.254	44.600	-11.401	-53.401	-42.000	-8.801
844015	52113	72 sengepladser, Sisimiut	49.301	14.200	63.501	-13.880	49.622	64.250	-14.628	-79.282	-64.653	-15.032
844015	52114	219 sengepladser, Nuuk	113.987	12.000	125.987	-34.647	91.341	131.500	-40.183	-226.035	-185.851	-94.535
844015	52115	74 sengepladser, Qaqortoq	41.129	10.000	51.129	-39.604	11.526	51.850	-40.342	-66.344	-26.002	-14.494
844015	52117	Renovering af kollegier, Paamiut	-32		-32	32	0		0	-32	-32	-32
844015 Total			264.441	59.200	323.641	-107.462	216.180	396.878	-184.485	-576.066	-391.578	-179.188
844016	55022	Nationale tegningsarkiv	0		0		0		0	-301	-301	-301
844016	56003	Ny KNR	-250		-250		-250	12.120	-12.370	-12.402	-32	-282
844016 Total			-250		-250		-250	12.120	-12.370	-12.703	-333	-583
844017	41044	Færdiggørelse af integreret institution, Attu	0		0		0		0		0	
844017	41048	Pulje til etablering af daginstitutioner	-2		-2	2	0		0	-2	-2	-2
844017	41050	Daginstitution i Atammik, 2015	187		187	-178	9	2.400	-2.391	-2.400	-9	0
844017 Total			185		185	-176	9	2.400	-2.391	-2.402	-11	-2
844018	50148	Køb af hus til Ado Lyngep Atuarfia		475	475	-427	48	475	-427	-427	0	48
844018 Total				475	475	-427	48	475	-427	-427	0	48
844501	58041	Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	476		476		476	1.455	-979	-1.069	-91	386
844501	58046	Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	-374		-374		-374		-374	-374	0	-374
844501 Total			102		102		102	1.455	-1.353	-1.443	-91	12
855020	72003	Is-fjordscenteret, Ilulissat	5.000		5.000	-5.000	0	15.000	-15.000	-10.000	5.000	5.000
855020	72004	Etablering af Visitorcentre	10.300		10.300		10.300	10.300				10.300
855020	72010	Nuuk Natur- og	4.750	5.000	9.750		9.750	9.750				9.750

		geopark										
855020	72011	Nationale seværdigheder	-4.650		-4.650		-4.650	-4.650				-4.650
855020 Total			15.400	5.000	20.400	-5.000	15.400	30.400	-15.000	-10.000	5.000	20.400
866001	46009	Laboratorium/DIH, Nuuk	18		18		18		18		-18	
866001	46015	DIH 3. fløj, Nuuk	-3	-33.887	-33.890	33.890	0	0	0	-33.928	-33.928	-33.928
866001	46017	Patienthotel, Nuuk	-2		-2	-25	-27	66.522	-66.549	-66.549	0	-27
866001	46019	Elektronisk Patient Journal	0	-33.500	-33.500	33.500	0	0	0	-33.500	-33.500	-33.500
866001	46020	Nedrivning af gammel operationsbygning	0	-4.500	-4.500	4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
866001	46021	Psykiatribygning i Nuuk	-5.982	8.000	2.018	-1.083	935	23.000	-22.065	-24.158	-2.093	-1.158
866001	46023	Energioptimering DIH, Nuuk	1.270		1.270	-195	1.076	7.000	-5.924	-5.924	0	1.076
866001	46026	Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	43		43		43	1.900	-1.857	-1.857	0	43
866001	46027	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	221		221		221	2.500	-2.279	-2.279	0	221
866001	46028	Patienthotel i Aasiaat	-1.026		-1.026	-19	-1.046	16.911	-17.957	-17.640	317	-729
866001	46029	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	281		281	-226	55	2.500	-2.445	-2.701	-256	-201
866001	46030	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	982		982		982	3.000	-2.018	-2.017	1	983
866001	46031	Projektering af ny sengefløj og patienthotel	1.000	2.000	3.000	-55	2.945	3.000	-57	-653	-596	2.347
866001	46032	Rømning af byggegrund	3.000		3.000		3.000	3.000				3.000
866001	46033	Steno Diabetes Center	1.639		1.639	1.365	3.004		2.991	3.377	386	3.377
866001	46034	Anskaffelser af ambulancer		5.000	5.000	-448	4.552	5.000	-448	-448	0	4.552
866001	47026	sKOLETANDKLINIK usk	0		0		0		0		0	

866001	47031	Udbygning DIH - fondsmidler	-1.829		-1.829	1.692	-136	53.428	-53.564	-193.660	-140.096	-140.232
866001	47032	Ambulancer	5	-6.500	-6.495	6.495	0	0	0	-6.495	-6.495	-6.495
866001	47033	Skoletandklinik, Nanortalik	0		0		0		0		0	
866001	47037	Flytning af tandplejen, Qasigiannguit	0		0		0		0		0	
866001	47038	Autoklaver til kystsygehuse	0	-1.900	-1.900	1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
866001	47041	Ilt produktions anlæg i sygehuse	2.827		2.827		2.827	6.500	-3.673	-3.673	0	2.827
866001	47042	Regionssygehus i Sisimiut	0	2.400	2.400	-8	2.392	2.400	-8	-8	0	2.392
866001	47047	Børneafdeling på DIH, Nuuk	300		300		300	500	-200	-202	-3	298
866001	47051	Apparaturpuljen	20.585	13.500	34.085	-8.389	25.696	103.100	-77.404	-77.404	0	25.696
866001	47053	Vedligeholdelseeftersl æb	9.247	27.000	36.247	-22.648	13.599	107.000	-93.401	-93.401	0	13.599
866001	47055	Diverse nyanlæg og renovering	109.854	24.050	133.904		133.904	134.050	-146	-149	-3	133.901
866001	47060	Nyt operationsafsnit, Sisimiut		2.550	2.550	-5.170	-2.620	2.550	-5.178	-5.178	0	-2.628
866001	48010	Tandklinik Paamiut, Renovering	0		0		0		0		0	
866001	48013	Centralklinik i Nuuk	10	7.000	7.010		7.010	9.218	-2.244	-3.367	-1.119	5.851
866001	48014	Inventar til tandklinik, Ilulissat	0		0		0		0	-2.603	-2.603	-2.603
866001	49035	Konsultation, Illorsuit	0		0		0		0	-3.896	-3.896	-3.896
866001	51016	Vandskade på PI- center i Nuuk	0		0		0		0		0	
866001	Total		142.440	11.213	153.653	45.076	198.730	553.079	-354.408	-584.713	-230.302	-31.634
870088	29105	Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009	0		0		0		0	-11.500	-11.500	-11.500
870088	29107	Vej i Sydgrønland	1.821		1.821		1.821	29.825	-28.004	-28.093	-89	1.732
870088	29108	Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	5.000		5.000	-502	4.498	5.000	-502	-502	0	4.498
870088	Total		6.821		6.821	-502	6.319	34.825	-28.506	-40.095	-11.589	-5.270

871106	73010	5-års eftersyn, 2015	0		0		0		0	-66	-66	-66
871106	73011	5 års eftersyn, 2016	0		0		0		0	-53	-53	-53
871106	73014	5-års eftersyn, 2019	304		304		304	500	-196	54	252	554
871106	73015	5-års eftersyn, 2020	220		220	-14	206	500	-294	-262	33	238
871106	73016	5-års eftersyn		500	500	-200	300	500	-200	-174	26	326
871106 Total			524	500	1.024	-214	810	1.500	-690	-501	192	999
871109	23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	38.196	-5.000	33.196	-2.290	30.908	77.153	-46.759	-48.863	-2.103	28.290
871109 Total			38.196	-5.000	33.196	-2.290	30.908	77.153	-46.759	-48.863	-2.103	28.290
877002	10048	Køb af B-1802, KANUKOKA	0	-20.075	-20.075	20.075	0	0	0	-20.075	-20.075	-20.075
877002	10052	"Køb af B-3953 ""Forfatningskommissionen""	0	-6.995	-6.995	6.995	0	0	0	-6.995	-6.995	-6.995
877002 Total			0	-27.070	-27.070	27.070	0	0	0	-27.070	-27.070	-27.070
877003	29106	Vestnorden Foresight 2030 - Fondsmidler	0		0		0		0		0	
877003 Total			0		0		0		0		0	
877208	31021	Reinvestering, 2008	0		0		0		0		0	
877208 Total			0		0		0		0		0	
877210	30005	Personaleboliger i Nuuk	0		0		0		0		0	
877210	30012	Personaleboliger i Nuuk	9.650	3.500	13.150	-20	13.130	22.000	-8.870	-13.099	-4.229	8.901
877210 Total			9.650	3.500	13.150	-20	13.130	22.000	-8.870	-13.099	-4.229	8.901
877211	32003	12 boliger afs. 3, Nanortalik	0		0		0		0		0	
877211 Total			0		0		0		0		0	
877213	97015	Renovering B-500 & B-700, Ilu.	0		0		0		0		0	
877213	97085	Renovering B-294, B-295	0	-9.454	-9.454	9.454	0	0	0	-9.454	-9.454	-9.454
877213	97150	Renovering diverse steder, 2009	-4	-18.432	-18.436	18.436	0	0	0	-15.926	-15.926	-15.926
877213	97151	Renovering diverse	0	-3.337	-3.337	3.337	0	0	0	-3.337	-3.337	-3.337

		steder, 2010										
877213	97157	Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	82		82	-3	79	11.000	-10.921	-11.285	-365	-285
877213 Total			78	-31.223	-31.145	31.224	79	11.000	-10.921	-40.002	-29.082	-29.002
877221	32066	Støttet kom. udl.byggeri, 2006	0		0		0	21.366	-21.366	-21.366	0	0
877221	32067	Støttet kom. udl.byggeri, 2007	-1	-36.573	-36.574	36.574	0	0	0	-36.574	-36.574	-36.574
877221	32068	Støttet kom. udl.byggeri, 2008	0	-44.513	-44.513	44.513	0	0	0	-44.513	-44.513	-44.513
877221	32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	-1.555		-1.555		-1.555	69.800	-71.355	-71.355	0	-1.555
877221 Total			-1.556	-81.086	-82.642	81.087	-1.555	91.166	-92.721	-173.808	-81.087	-82.642
877222	35018	Boligprg.f/bygder og yderd. 2009	0		0		0		0		0	
877222	35019	Boligprg.f/bygder og yderd. 2010	0		0		0		0		0	
877222	35024	Boligprg.f/bygder og yderd. 2014	0		0		0		0	-22.787	-22.787	-22.787
877222	35025	Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	-707		-707		-707	8.400	-9.107	-9.131	-22	-731
877222	36106	Udvikling og afprøvning af Illoput 2100	-153		-153		-153	2.480	-2.633	-2.473	160	7
877222	39039	Aktivitetshus til Kullorsuaq	3.500		3.500		3.500	3.500				3.500
877222 Total			2.640		2.640		2.640	14.380	-11.740	-34.391	-22.649	-20.011
877225	92002	Sanering af blok Q, R og S, Nuuk og privat nybygge	0		0		0		0		0	
877225	92003	Sanering af boligblokke, Paamiut	0		0		0		0		0	
877225 Total			0		0		0		0		0	
877310	24111	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	2.737		2.737		2.737	8.700	-5.963	-8.707	-2.745	-7
877310	24112	Sektorplan for havne, 2015	2.043		2.043		2.043	2.500	-457	-458	0	2.042
877310 Total			4.780		4.780		4.780	11.200	-6.420	-9.165	-2.745	2.035

877312	24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	3.413	25.200	28.613	-10.621	17.994	169.869	-154.253	-160.381	-6.127	9.488
877312	24122	Sektorplaner for havne	3.600		3.600		3.600	3.700	-100	-104	-4	3.596
877312	24128	Diverse nyanlæg	1.318	20.000	21.318		21.318	21.522	-204	-204	0	21.318
877312	24129	Havn i Kangerlussuaq	3.894		3.894	-260	3.634	4.000	-366	-359	7	3.641
877312	24130	Læmole i Qaanaaq	-90		-90	-846	-936	33.000	-33.936	-33.813	123	-813
877312	24131	Havnefaciliteter i Uummannaq	12.317		12.317	-7.874	4.443	34.100	-29.657	-32.084	-2.428	2.016
877312	24136	Etablering af anløbsfaciliteter	3.483		3.483	-337	3.145	4.150	-1.005	-1.005	0	3.145
877312	Total		27.935	45.200	73.135	-19.938	53.198	270.341	-219.521	-227.950	-8.429	42.391
877320	25174	Paamiut Lufthavn	0		0		0		0		0	
877320	25184	Lufthavn ved Qaqortoq	0		0		0		0		0	
877320	25194	Tasiilaq	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-5	-5	-5
877320	25195	Ittoqqortoormiit	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-5	-5	-5
877320	25196	Qeqertarsuaq	1.483	-1.000	483		483	500	-17	-11	6	489
877320	25197	Kangaatsiaq	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-11	-11	-11
877320	25198	Qasigiannuguit	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-11	-11	-11
877320	25199	Narsaq	991	-1.000	-9	9	0	0	0	-3	-3	-3
877320	25200	Nanortalik	985	-1.000	-15		-15	0	-15	-9	6	-9
877320	25201	Kangerlussuaq	999		999	-150	849	1.000	-151	-151	0	849
877320	25204	Uummannaq, landingsbane	994	-1.000	-6		-6	0	-6	-6	0	-6
877320	Total		11.384	-10.000	1.384	-73	1.311	1.500	-189	-212	-23	1.288
877322	20039	Lovliggørelse af elforsyning	0	-5.775	-5.775	5.775	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
877322	25038	Radiofy, renovering	828		828		828		828		-828	
877322	25158	Banerenerovering, Ilulissat	0		0		0		0		0	
877322	25182	Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	-387		-387	-367	-754	24.957	-25.711	-25.711	0	-754
877322	25183	Langsigtede	2.698	10.000	12.698	-3.168	9.531	40.000	-30.469	-30.436	33	9.564

		investeringsbehov										
877322	25186	Udbedring skimmelsvamp angreb, Sisimiut	0	-1.710	-1.710	1.710	0	0	0	0	0	0
877322	25188	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	-49		-49		-49	18.100	-18.149	-18.149	0	-49
877322	25190	Rullende materiel	0		0		0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
877322	25191	Tilstandsregistrering af heliportbygninger	-14	-100	-114	114	0	0	0	-114	-114	-114
877322	25193	Vej til lufthavn i Qaanaaq	1.200		1.200		1.200	4.500	-3.300	-4.097	-797	403
877322	25203	Sikkerhedsudstyr til lufthavne	11	-10.200	-10.189	10.189	0	0	0	-18.745	-18.745	-18.745
877322	25206	Rullende materiel	9.984		9.984	-10.289	-305	11.100	-11.405	-11.100	305	0
877322	25207	Helikopterflyvepladser	-251		-251	-1	-252	5.000	-5.252	-5.251	1	-251
877322	25208	Vejrobservationstjeneste til lufthavne	2.909		2.909	-1.017	1.893	3.900	-2.007	-1.779	229	2.121
877322	25212	Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	-904		-904	939	34	5.900	-5.866	-5.900	-34	0
877322	25213	Hangar til helikopter	9.130		9.130	-7.109	2.021	26.000	-23.979	-26.000	-2.021	0
877322	25214	Hangar til Tasiilaq		29.300	29.300	-7.432	21.868	29.300	-7.432	-29.300	-21.868	0
877322	25938	TD:Radiofy, renovering	-18	-6.500	-6.518	6.518	0	0	0	-6.518	-6.518	-6.518
877322	Total		25.137	15.015	40.152	-4.138	36.015	168.757	-132.742	-202.000	-69.257	-33.243
877501	61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	41.833		41.833	-44.073	-2.239	220.000	-222.239	-123.539	98.700	96.461
877501	Total		41.833		41.833	-44.073	-2.239	220.000	-222.239	-123.539	98.700	96.461
877502	74002	Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas	1	13.742	13.743	-13.743	0	0	0	13.743	13.743	13.743
877502	Total		1	13.742	13.743	-13.743	0	0	0	13.743	13.743	13.743
877503	74005	Tilskud til kommunale miljøanlæg	2.438		2.438		2.438	44.500	-42.062	-44.405	-2.343	95
877503	Total		2.438		2.438		2.438	44.500	-42.062	-44.405	-2.343	95
897140	15001	Vandkraftværk, Qorlortorsuaq	0		0		0		0		0	

897140	17772	Vandbehandlingsanlæg	0		0		0	12.600	-12.600	-12.600	0	0
897140	17773	Udlån til Nukissiorfiit, 2016	0	-7.400	-7.400	7.400	0	0	0	-7.400	-7.400	-7.400
897140	17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
897140	17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	0	-78.400	-78.400	78.400	0	0	0	-78.400	-78.400	-78.400
897140	17776	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
897140	17778	Udlån til Nukissiorfiit, 2021		60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	60.000	60.000	60.000
897140	21077	Etabl. af vandkraftværk i Kulusuk	0	-18.100	-18.100	18.100	0	0	0	-18.100	-18.100	-18.100
897140	Total		0	-163.900	-163.900	163.900	0	72.600	-72.600	-116.500	-43.900	-43.900
897141	28028	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2013	0		0		0	6.500	-6.500	-6.500	0	0
897141	28029	Særlige byggemodning i Qinngorput	0	-95.400	-95.400	95.400	0	0	0	0	0	0
897141	Total		0	-95.400	-95.400	95.400	0	6.500	-6.500	-6.500	0	0
897212	30014	Alsidige boliger 2015, Qaqortoq	-151		-151		-151	27.800	-27.951	-27.951	0	-151
897212	30015	Alsidige boliger 2015, Maniitsoq	-220		-220	-519	-739	46.600	-47.339	-47.364	-25	-764
897212	30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	2.043	3.000	5.043	-996	4.046	79.710	-75.664	-77.166	-1.501	2.544
897212	30019	Funktionelle boliger, Ilulissat	10.405	20.000	30.405	-21.169	9.238	48.000	-38.762	-58.443	-19.680	-10.443
897212	30025	Nye boliger 2019, Qaqortoq	-385	15.000	14.615	-10.946	3.668	23.300	-19.632	-27.870	-8.238	-4.570
897212	30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	678	23.500	24.178	-6.197	17.981	25.100	-7.119	-50.972	-43.854	-25.872
897212	30028	Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	499		499	-16	483	1.200	-717	-712	5	488
897212	31028	Skimmelsvamps renovering	0		0		0		0		0	
897212	31029	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	3.611		3.611	-2.758	853	40.000	-39.147	-39.147	0	853
897212	31030	Diverse nedrivning	12.134	2.000	14.134	-9.259	4.875	22.300	-17.440	-20.793	-3.353	1.507

		Qaqortoq										
897212	31031	Diverse nedrivning Narsaq	5.318		5.318	-108	5.210	16.000	-10.791	-10.909	-117	5.091
897212	31032	Diverse nedrivning Paamiut	8.933	4.500	13.433	-481	12.951	29.500	-16.549	-16.256	292	13.244
897212	31033	Diverse nedrivning Nuuk	123		123		123	12.300	-12.177	-12.183	-7	117
897212	31034	Diverse nedrivning Maniitsoq	4.170		4.170	-822	3.348	16.500	-13.502	-13.552	-50	2.948
897212	31035	Diverse nedrivning Sisimiut	3.186		3.186	117	3.303	10.000	-6.697	-7.739	-1.042	2.261
897212	31036	Diverse nedrivning Aasiaat	1.018	3.000	4.018	-441	3.577	5.794	-2.708	-4.372	-1.665	1.422
897212	31037	Skimmel reovering	15.373	4.500	19.873	-16.465	3.408	53.700	-50.527	-51.684	-1.160	2.016
897212	31040	Diverse nedrivning Nanortalik	771		771		771	3.500	-2.729	-2.850	-121	650
897212	31042	Diverse nedrivning Qasigiannugit	3.401		3.401	-13	3.388	7.000	-3.612	-3.636	-24	3.364
897212	31043	Landsdækkende skimmelreovering	7.052	1.500	8.552	-4.089	4.464	31.000	-26.645	-27.546	-907	3.454
897212	31045	Diverse nedrivning Ilulissat	1.698	1.200	2.898		2.898	2.900	-2	-2	0	2.898
897212	31046	Renovering af boliger, Aasiaat	-177		-177		-177	12.706	-12.883	-12.883	0	-177
897212	31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	18.919	-13.700	5.219	-3.330	1.889	82.400	-80.511	-81.562	-1.050	838
897212	31049	Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	609		609	168	777	11.100	-10.323	-10.026	299	1.074
897212	31050	Renovering af altaner, Qaqortoq	12.899		12.899	-6.706	6.193	16.700	-10.507	-14.630	-4.123	2.070
897212	31051	Renovering af altaner, Paamiut	7.943		7.943	-3.809	4.134	11.400	-7.266	-10.013	-2.747	1.387
897212	31053	Renovering af altaner, Maniitsoq	15.827		15.827	-11.367	4.460	19.800	-15.340	-17.066	-1.725	2.734
897212	31055	Renovering af altaner, Sisimiut	14.224		14.224	-7.876	6.348	15.000	-8.652	-11.923	-3.271	3.077
897212	31058	Skimmel reovering, Qaqortoq	2.000	2.000	4.000	-2.871	1.129	4.000	-2.871	-3.429	-558	571

897212	31059	Skimmel renovering, Maniitsoq	2.000	2.000	4.000		4.000	4.000				4.000
897212	31060	Skimmel renovering, Sisimiut	5.000	3.000	8.000	-15	7.985	8.000	-15	-15	0	7.985
897212	31062	Skimmel renovering, Aasiaat	1.500	-1.500	0		0	0				0
897212	31063	Skimmel renovering, Ilulissat	2.000	1.500	3.500		3.500	3.500				3.500
897212	31064	Nedrivning af BSU-huse	8.157		8.157	-872	7.285	8.200	-915	-576	339	7.624
897212	31065	Renovering af Eqalagalinnuguit, Nuuk	12.839	3.500	16.339	-9.959	6.380	16.400	-10.685	-14.428	-3.743	1.972
897212	31066	Fornyelse af installationer i flere byer	45.200		45.200	-8.417	36.783	45.200	-9.551	-10.070	-519	35.130
897212	32124	Boliger	14.171	-7.800	6.371	-1.624	4.749	29.540	-24.791	-27.585	-2.794	1.955
897212	32125	16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014	0	-12.800	-12.800	12.800	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
897212	32126	16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014	-17	-12.800	-12.817	12.817	0	0	0	-12.817	-12.817	-12.817
897212	32127	12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	-366		-366		-366	7.900	-8.266	-8.266	0	-366
897212	32128	12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	-678		-678		-678	7.900	-8.578	-8.578	0	-678
897212	32129	Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	12.033		12.033		12.033	26.700	-14.667	-26.712	-12.045	-12
897212	32131	8 boliger, Qaanaaq 2014	38	-11.750	-11.712	11.712	0	0	0	-12.016	-12.016	-12.016
897212	32132	12 boliger, Aasiaat 2014	0		0		0		0	-13.000	-13.000	-13.000
897212	32133	24 boliger, Ilulissat 2014	17.922		17.922		17.922	18.000	-78	-105	-27	17.895
897212	32134	4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	-4		-4	-160	-163	20.566	-20.729	-21.933	-1.202	-1.367
897212	32137	Projektering af ældrevenlige boliger	-3		-3	3	0		0	-3	-3	-3
897212	32139	Tilskud til renovering og sanering af boliger	0	-4.000	-4.000	4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

897212	32140	Ungdomsboliger - typehus	2.300		2.300	-1.645	655	2.300	-1.645	-2.005	-361	295
897212	32141	Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	14.533	1.500	16.033	-4.825	11.208	16.100	-4.892	-17.580	-12.688	-1.480
897212	34510	300 boliger, Nuuk	0		0		0		0	-33.000	-33.000	-33.000
897212	34513	96 boliger, Innartalik, Nuuk	0		0		0		0	-126.082	-126.082	-126.082
897212	34514	Sanering af blok P	0		0		0		0		0	
897212	34515	Erstatningsbyggeri for Blok P	0		0		0		0		0	
897212	34517	Byhuse	1	-144.002	-144.001	144.001	0	0	0	-144.001	-144.001	-144.001
897212	34518	Radiofjeldet, nybyggeri	0		0		0		0		0	
897212	34519	84 boliger Pisissia, Nuuk	0		0		0		0	-62.380	-62.380	-62.380
897212	34522	Boliger i Pisissia, byggefelt 8	0		0		0		0		0	
897212	34525	28 boliger ved Sarfarsuit	0		0		0		0		0	
897212	34526	16 boliger ved Sarfaarsuit	0		0		0		0		0	
897212	34527	Diverse renovering og sanering	56.751	64.300	121.051	-35.791	85.261	314.055	-229.693	-260.858	-31.167	53.197
897212	34528	Genhusningcenter for lejere i Nuuk	0	-7.712	-7.712	7.712	0	0	0	-7.712	-7.712	-7.712
897212	34534	Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	-100		-100		-100		-100	-100	0	-100
897212	36101	Bygder- og yderdistrikter	-8		-8		-8	15.000	-15.008	-15.008	0	-8
897212	38013	Test Lab	0		0		0		0		0	
897212	38016	Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer	100	-100	0		0	0				0
897212	38017	Udvikling af Illoq Nutaaq	-98		-98		-98	700	-798	-879	-81	-179
897212	38018	Forundersøgelser i Qaanaaq	-154		-154		-154	2.600	-2.754	-2.754	0	-154
897212	39034	4 kommunale byggesæt, Kangerlussuaq 2014	0		0		0		0		0	

897212	39041	Genhusning efter oversvømmelse	-27.134		-27.134	-1.677	-28.812	81.554	-110.366	-110.500	-134	-28.946
897212	39043	Opførelse af boliger, Qaarsut		23.100	23.100	-9.365	13.735	23.100	-9.365	-22.862	-13.497	238
897212 Total			317.884	-37.064	280.820	8.742	289.565	1.326.625	-1.040.959	-1.641.304	-600.352	-314.679
		Afrunding	-82			7	7					
		Periodisering				187	92					
Hovedtotal			1.078.022	-316.181	761.923	255.162	1.017.003	4.606.363	-3.602.007	-5.229.322	-1.697.226	-623.073

Bilag 2: Projektstatus

Finanslov	Projekt	Status	Projektstitel	Primo forrige år	Bevilling IÅ	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværen de finansår	Forbrug total	Disponering	Disponeret vs forbrug	Rest disponering	År
011014	10019	Til intern revision	Udvidelse af Landstingssal	-75		-75		-75	3.379	-3.454	-3.455	0	-76	2021
011014	10053	Til intern revision	Ny bygning til Inatsisatut	1.489		1.489		1.489	3.000	-1.511	-1.877	-366	1.123	2021
011015	10049	Igangværende	22 mindre boliger til Inatsisartut	1.936		1.936		1.936	6.000	-4.064	-4.286	-222	1.714	2021
758620	14001	Lukket	Indkøb af olieberedskab	0		0		0		0		0		2021
800001	80800	Igangværende	Omrokeringsreserve	0	9.800	9.800		9.800	9.800				9.800	2021
800010	80801	Igangværende	Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	2.513	0	2.513		2.513	0	2.513		-2.513	0	2021
800080	80802	Igangværende	Disp. til påpg.projekteringer	3.000	-3.000	0		0	0				0	2021
811002	10054	Igangværende	Selvstyrets Central Administration		1.300	1.300		1.300	1.300				1.300	2021
812002	10047	Lukket	Indkøb af IT-server udstyr samt tilhr. el/IT	0		0		0		0		0		2021
813673	18303	Lukket	TD:Ren. fj.varmeledningsnet	0		0		0		0		0		2021
822002	90022	Igangværende	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	4.030		4.030	-19.379	-15.349	75.942	-90.713	-55.813	-34.900	20.129	2021
822002	90028	Igangværende	Udvikling af ERP		1.000	1.000		1.000	1.000				1.000	2021
822003	40089	Igangværende	Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	11.000		11.000	-114	10.886	11.000	-114			10.886	2021
822401	90020	Lukket	Nyt IT-system	0		0		0		0		0		2021
822401	90024	Igangværende	Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	3.600	1.800	5.400	-2.087	3.313	5.400	-2.087	-2.087	0	3.313	2021
822401	90025	Igangværende	Beskæftigelsesfradrag				-1.384	-1.384		-1.384	-1.384	0	-1.384	2021
822402	25192	Igangværende	Krops- og narkoskannere	0		0		0	0	0	-1.975	-1.975	-1.975	2021

833012	44029	Lukket	Projektering alderdomshjem, Man.	0		0		0		0		0		2021
833012	44033	Lukket	Plejhjem i Qaqortoq	0		0		0		0	-21.550	-21.550	-21.550	2021
833012	44044	Igangværende	Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	1.742		1.742		1.742	13.575	-11.833	-13.581	-1.748	-6	2021
833012	44047	Igangværende	Alderdomshjem i Paamiut	2.230		2.230		2.230	27.500	-25.270	-27.506	-2.236	-6	2021
833012	44048	Igangværende	Pulje til nyanlæg og renovering	3.300	4.400	7.700		7.700	7.700				7.700	2021
833012	44049	Til intern revision	Tilstandsregistrering af ældreområdet	-63		-63		-63	3.600	-3.663	-3.832	-169	-232	2021
833012	44051	Igangværende	Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	-1.063	11.400	10.337	-3.817	6.520	16.350	-12.347	-23.663	-11.316	-7.313	2021
833012	44053	Igangværende	Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	17.994		17.994	-4.790	13.204	18.000	-4.796	-18.006	-13.210	-6	2021
833012	44054	Igangværende	Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	9.009		9.009	-5.142	3.867	16.400	-12.533	-16.406	-3.873	-6	2021
833012	44056	Igangværende	Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut				-460	-460		-460	-460	0	-460	2021
833013	40031	Lukket	Handicapsatellit, pilotprojekt	0		0		0		0		0		2021
833013	40036	Lukket	Familiebehandlingsafdel./B&U, Umq	0		0		0		0		0		2021
833013	40044	Lukket	Boliger til autister, Qaqortoq	0		0		0		0		0		2021
833013	40047	Lukket	Etabl. af et udslusningshjem f. unge mel. 18-23	0		0		0		0	-75	-75	-75	2021
833013	40054	Til intern revision	Landsdækkende handicap træningscenter	1.237		1.237		1.237	56.269	-55.032	-58.063	-3.030	-1.794	2021
833013	40058	Igangværende	Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	247		247	-106	141	7.600	-7.459	-7.412	47	188	2021
833013	40062	Igangværende	Udredningshjem	874	6.000	6.874	-745	6.129	14.400	-8.271	-8.589	-318	5.811	2021
833013	40063	Til intern	Misbrugsbehandlingshj	2		2		2	20	-18	-100	-82	-80	2021

		revision	em												
833013	40064	Til intern revision	Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	35		35	-98	-63	3.300	-3.363	-3.393	-30	-93	2021	
833013	40066	Igangværende	Opdeling af Aaqa i to institutioner	1.989		1.989	-10	1.979	2.000	-21	-11	10	1.989	2021	
833013	40067	Igangværende	Pulje til nyanlæg og renovering	54.089	-31.600	22.489	-23	22.467	22.520	-53	-31	23	22.489	2021	
833013	40068	Til intern revision	Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	277		277		277	2.500	-2.223	-2.225	-2	275	2021	
833013	40075	Til intern revision	Lukket gårdmiljø til Isikkivik	818		818		818	830	-12	-12	0	818	2021	
833013	40077	Igangværende	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	15.035	20.800	35.835	-23.298	12.536	65.020	-52.484	-53.631	-1.147	11.389	2021	
833013	40081	Til intern revision	Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	-12		-12		-12	40	-52	-52	0	-12	2021	
833013	40084	Igangværende	Genopførelse af udslusninghjem, Uummanaq	6.601		6.601	-1.567	5.035	5.315	-280	-6.357	-6.078	-1.042	2021	
833013	40085	Lukket	Genopretning af brandskade, Uummanaq	-1.534		-1.534	1.534	0		0	0	0	0	2021	
833013	40086	Igangværende	Døgninstitution for børn med sindslidelser	5.968		5.968	-538	5.430	6.000	-570	-732	-162	5.268	2021	
833013	40087	Lukket	Institution for børn og voksne med multihandicap	6.000	-6.000	0		0	0				0	2021	
833013	40090	Igangværende	Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	251	4.000	4.251	-2.561	1.690	7.000	-5.267	-6.570	-1.303	430	2021	
833013	40091	Igangværende	Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	6.604	27.600	34.204	-3.314	30.891	34.500	-3.609	-3.734	-125	30.766	2021	
844009	51010	Lukket	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	0	-52.200	-52.200	52.200	0	0	0	-52.200	-52.200	-52.200	2021	
844009	51013	Til intern revision	Udvidelse INUILLI, Narsaq	-209		-209		-209	61.400	-61.609	-61.033	576	367	2021	
844009	51017	Lukket	Vandskade på PI-Center, Nuuk	0		0		0		0		0		2021	

844009	51018	Lukket	AMK tilbygning til Piareersarfik, Ilulissat	0		0		0		0		0		2021
844010	50069	Til intern revision	Ren./ombygning udv. skole Qaqortoq	936		936		936	115.700	-114.764	-116.400	-1.636	-700	2021
844010	50083	Lukket	Skole i Kangersuatsiaq	0		0		0		0	-5.750	-5.750	-5.750	2021
844010	50091	Til intern revision	Skolen Aappilattoq	65		65		65	18.150	-18.085	-17.637	448	513	2021
844010	50107	Lukket	Ren./ombygning af skole, Nanortalik	0		0		0		0		0		2021
844010	50108	Lukket	Ren./ombygning Ming-skolen, Sisimiut	0		0		0		0		0		2021
844010	50110	Lukket	Skole, Narsaq	0		0		0		0	-72.485	-72.485	-72.485	2021
844010	50111	Til intern revision	Ren./ombygning/udv. skole, Sarfannguit	514		514		514	9.500	-8.986	-9.517	-531	-17	2021
844010	50115	Til intern revision	Ren./ombygning/udv. skole, Nuussuaq	770		770		770	9.800	-9.030	-9.032	-3	768	2021
844010	50119	Lukket	Ren./ombygning/udv. skole, Itilleq	0		0		0		0		0		2021
844010	50126	Til intern revision	Udv./ren./ombygning af skole, Upv. Kujalleq	2.630		2.630		2.630	13.700	-11.070	-11.314	-244	2.386	2021
844010	50128	Lukket	Om- og tilbygning af Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisi	0		0		0		0	-26.000	-26.000	-26.000	2021
844010	50131	Til intern revision	Ny skole i Ilulissat	202		202		202	192.655	-192.453	-195.266	-2.812	-2.611	2021
844010	50132	Til intern revision	Diverse skole, nyanlæg og renovering	-7.254		-7.254	0	-7.254	-1.050	-6.204	-6.178	25	-7.228	2021
844010	50133	Til intern revision	Bygdeskole, Alluitsup Paa	-1.510		-1.510		-1.510	27.850	-29.360	-29.818	-459	-1.968	2021
844010	50143	Lukket	Ren./ombygning af skolen, Kangaatsiaq	0	-13.950	-13.950	13.950	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	2021
844012	51021	Igangværende	Projektplan for udflytning af udd. inst.	-329		-329	0	-329	2.500	-2.829	-3.076	-247	-576	2021
844012	51024	Igangværende	Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	9.948		9.948	-518	9.430	10.000	-570	-888	-318	9.112	2021
844012	51026	Igangværende	Landbrugsskole i Upernaviarsuk	2.946		2.946	-73	2.873	3.000	-131	-460	-329	2.540	2021
844012	52043	Lukket	Udbygning GU Nuuk, 2. etape	0		0		0		0		0		2021

844012	52061	Til intern revision	Udvidelse af GU, Aasiaat	-183		-183		-183	89.400	-89.583	-89.583	0	-183	2021
844012	52085	Til intern revision	Renov. af udd. bygninger Qeq. kommunia	-62		-62		-62	309	-371	-330	40	-21	2021
844012	52086	Til intern revision	Udvidelse af PISPS, Ilulissat	-815		-815		-815	44.344	-45.159	-45.157	2	-813	2021
844012	52087	Til intern revision	Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	470		470		470	104.400	-103.930	-104.385	-454	15	2021
844012	52088	Til intern revision	Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	-551		-551		-551	12.500	-13.051	-13.051	-1	-551	2021
844012	52094	Igangværende	Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	-2.079		-2.079	-881	-2.959	19.691	-22.650	-22.537	113	-2.846	2021
844012	52095	Igangværende	Skolepraktikhaller og haller til ko	1.212		1.212	-265	947	36.500	-35.564	-36.206	-642	294	2021
844012	52099	Lukket	Køb af fast ejendom til Vejlednings- psyk.-soc.råd	0	-4.133	-4.133	4.133	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	2021
844014	54007	Igangværende	Tilskud til renovering af idrætshaller	2.218	3.500	5.718	-123	5.595	17.900	-12.305	-12.735	-430	5.165	2021
844014	54008	Lukket	Projektering af kunstgræsbaner, 2017	-1		-1	1	0		0	-1	-1	-1	2021
844015	52060	Lukket	Elevhjem i Nanortalik	0		0		0		0	-4.219	-4.219	-4.219	2021
844015	52063	Lukket	Projekt. og opf. af 42 kollegier Nuuk 2011	0		0		0		0		0		2021
844015	52064	Lukket	Projektering og opf. af kollegier i Sisimiut 2011	0		0		0		0		0		2021
844015	52065	Lukket	Projektering og opf. af kollegier i Aasiaat 2011	0		0		0		0		0		2021
844015	52066	Lukket	Tilstandsregistrering af elevhjem og kollegier	0		0		0		0		0		2021
844015	52071	Til intern revision	Skolehjem med 50 værelser , Uummanaq	-474		-474		-474	32.000	-32.474	-32.474	0	-474	2021
844015	52077	Lukket	Kollegiebyggeri i Kujalerpaat, Nuuk 1. etape	0		0		0		0	-12.162	-12.162	-12.162	2021
844015	52091	Lukket	Kollegiebyggeri i Paamiut	0		0		0		0	-15.571	-15.571	-15.571	2021

844015	52092	Igangværende	Etablering/renovering elevhjem Qassiaruk	6.224		6.224	-979	5.243	20.700	-15.516	-18.117	-2.600	2.583	2021
844015	52101	Til intern revision	Projektering af standardkollegier, 2015	-304		-304		-304	2.078	-2.382	-2.382	0	-304	2021
844015	52102	Igangværende	Projektering af standardkollegier	133	3.000	3.133	-15	3.118	6.000	-2.882	-2.953	-71	3.047	2021
844015	52103	Til intern revision	Projektering af standardkollegier, 2017	14		14		14	2.100	-2.086	-2.127	-41	-27	2021
844015	52104	Igangværende	Diverse kollegieprojekter	-10.559		-10.559		-10.559		-10.559	-10.559	0	-10.559	2021
844015	52111	Igangværende	32 sengepladser, Aasiaat	31.089	10.000	41.089	-9.690	31.399	41.800	-12.032	-50.408	-38.376	-8.608	2021
844015	52112	Igangværende	70 sengepladser, Ilulissat	33.933	10.000	43.933	-8.679	35.254	44.600	-11.401	-53.401	-42.000	-8.801	2021
844015	52113	Igangværende	72 sengepladser, Sisimiut	49.301	14.200	63.501	-13.880	49.622	64.250	-14.628	-79.282	-64.653	-15.032	2021
844015	52114	Igangværende	219 sengepladser, Nuuk	113.987	12.000	125.987	-34.647	91.341	131.500	-40.183	-226.035	-185.851	-94.535	2021
844015	52115	Igangværende	74 sengepladser, Qaqortoq	41.129	10.000	51.129	-39.604	11.526	51.850	-40.342	-66.344	-26.002	-14.494	2021
844015	52117	Lukket	Renovering af kollegier, Paamiut	-32		-32	32	0		0	-32	-32	-32	2021
844016	55022	Lukket	Nationale tegningsarkiv	0		0		0		0	-301	-301	-301	2021
844016	56003	Til intern revision	Ny KNR	-250		-250		-250	12.120	-12.370	-12.402	-32	-282	2021
844017	41044	Lukket	Færdiggørelse af integreret institution, Attu	0		0		0		0		0		2021
844017	41048	Lukket	Pulje til etablering af daginstitutioner	-2		-2	2	0		0	-2	-2	-2	2021
844017	41050	Til intern revision	Daginstitution i Atammik, 2015	187		187	-178	9	2.400	-2.391	-2.400	-9	0	2021
844018	50148	Igangværende	Køb af hus til Ado Lyngep Atuarfia		475	475	-427	48	475	-427	-427	0	48	2021
844501	58041	Til intern revision	Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	476		476		476	1.455	-979	-1.069	-91	386	2021
844501	58046	Til intern revision	Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	-374		-374		-374		-374	-374	0	-374	2021

855020	72003	Igangværende	Is-fjordscenteret, Ilulissat	5.000		5.000	-5.000	0	15.000	-15.000	-10.000	5.000	5.000	2021
855020	72004	Igangværende	Etablering af Visitorcentre	10.300		10.300		10.300	10.300				10.300	2021
855020	72010	Igangværende	Nuuk Natur- og geopark	4.750	5.000	9.750		9.750	9.750				9.750	2021
855020	72011	Igangværende	Nationale seværdigheder	-4.650		-4.650		-4.650	-4.650				-4.650	2021
866001	46009	Til intern revision	Laboratorium/DIH, Nuuk	18		18		18		18		-18		2021
866001	46015	Lukket	DIH 3. fløj, Nuuk	-3	-33.887	-33.890	33.890	0	0	0	-33.928	-33.928	-33.928	2021
866001	46017	Til intern revision	Patienthotel, Nuuk	-2		-2	-25	-27	66.522	-66.549	-66.549	0	-27	2021
866001	46019	Lukket	Elektronisk Patient Journal	0	-33.500	-33.500	33.500	0	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	2021
866001	46020	Lukket	Nedrivning af gammel operationsbygning	0	-4.500	-4.500	4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	2021
866001	46021	Igangværende	Psykiatribygning i Nuuk	-5.982	8.000	2.018	-1.083	935	23.000	-22.065	-24.158	-2.093	-1.158	2021
866001	46023	Igangværende	Energioptimering DIH, Nuuk	1.270		1.270	-195	1.076	7.000	-5.924	-5.924	0	1.076	2021
866001	46026	Til intern revision	Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	43		43		43	1.900	-1.857	-1.857	0	43	2021
866001	46027	Til intern revision	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	221		221		221	2.500	-2.279	-2.279	0	221	2021
866001	46028	Til intern revision	Patienthotel i Aasiaat	-1.026		-1.026	-19	-1.046	16.911	-17.957	-17.640	317	-729	2021
866001	46029	Igangværende	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	281		281	-226	55	2.500	-2.445	-2.701	-256	-201	2021
866001	46030	Igangværende	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	982		982		982	3.000	-2.018	-2.017	1	983	2021
866001	46031	Igangværende	Projektering af ny sengefløj og patienthotel	1.000	2.000	3.000	-55	2.945	3.000	-57	-653	-596	2.347	2021
866001	46032	Igangværende	Rømning af byggegrund	3.000		3.000		3.000	3.000				3.000	2021

866001	46033	Igangværende	Steno Diabetes Center	1.639		1.639	1.365	3.004		2.991	3.377	386	3.377	2021
866001	46034	Igangværende	Anskaffelser af ambulancer		5.000	5.000	-448	4.552	5.000	-448	-448	0	4.552	2021
866001	47026	Lukket	SKOLETANDKLINIK usk	0		0		0		0		0		2021
866001	47031	Til intern revision	Udbygning DIH - fondsmidler	-1.829		-1.829	1.692	-136	53.428	-53.564	-193.660	-140.096	-140.232	2021
866001	47032	Lukket	Ambulancer	5	-6.500	-6.495	6.495	0	0	0	-6.495	-6.495	-6.495	2021
866001	47033	Lukket	Skoletandklinik, Nanortalik	0		0		0		0		0		2021
866001	47037	Lukket	Flytning af tandplejen, Qasigiannugit	0		0		0		0		0		2021
866001	47038	Lukket	Autoklaver til kystsygehuse	0	-1.900	-1.900	1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	2021
866001	47041	Igangværende	Ilt produktions anlæg i sygehuse	2.827		2.827		2.827	6.500	-3.673	-3.673	0	2.827	2021
866001	47042	Igangværende	Regionssygehus i Sisimiut	0	2.400	2.400	-8	2.392	2.400	-8	-8	0	2.392	2021
866001	47047	Igangværende	Børneafdeling på DIH, Nuuk	300		300		300	500	-200	-202	-3	298	2021
866001	47051	Igangværende	Apparaturpuljen	20.585	13.500	34.085	-8.389	25.696	103.100	-77.404	-77.404	0	25.696	2021
866001	47053	Igangværende	Vedligeholdelseefterslæb	9.247	27.000	36.247	-22.648	13.599	107.000	-93.401	-93.401	0	13.599	2021
866001	47055	Igangværende	Diverse nyanlæg og renovering	109.854	24.050	133.904		133.904	134.050	-146	-149	-3	133.901	2021
866001	47060	Igangværende	Nyt operationsafsnit, Sisimiut		2.550	2.550	-5.170	-2.620	2.550	-5.178	-5.178	0	-2.628	2021
866001	48010	Lukket	Tandklinik Paamiut, Renovering	0		0		0		0		0		2021
866001	48013	Igangværende	Centralklinik i Nuuk	10	7.000	7.010		7.010	9.218	-2.244	-3.367	-1.119	5.851	2021
866001	48014	Lukket	Inventar til tandklinik, Ilulissat	0		0		0		0	-2.603	-2.603	-2.603	2021
866001	49035	Lukket	Konsultation, Illorsuit	0		0		0		0	-3.896	-3.896	-3.896	2021
866001	51016	Lukket	Vandskade på PI-center i Nuuk	0		0		0		0		0		2021
870088	29105	Lukket	Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009	0		0		0		0	-11.500	-11.500	-11.500	2021
870088	29107	Igangværende	Vej i Sydgrønland	1.821		1.821		1.821	29.825	-28.004	-28.093	-89	1.732	2021

870088	29108	Igangværende	Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	5.000		5.000	-502	4.498	5.000	-502	-502	0	4.498	2021
871106	73010	Lukket	5-års eftersyn, 2015	0		0	0	0	0	0	-66	-66	-66	2021
871106	73011	Lukket	5 års eftersyn, 2016	0		0	0	0	0	0	-53	-53	-53	2021
871106	73014	Igangværende	5-års eftersyn, 2019	304		304	304	304	500	-196	54	252	554	2021
871106	73015	Igangværende	5-års eftersyn, 2020	220		220	-14	206	500	-294	-262	33	238	2021
871106	73016	Igangværende	5-års eftersyn		500	500	-200	300	500	-200	-174	26	326	2021
871109	23004	Igangværende	Transportkommissionen - forundersøgelser	38.196	-5.000	33.196	-2.290	30.908	77.153	-46.759	-48.863	-2.103	28.290	2021
877002	10048	Lukket	Køb af B-1802, KANUKOKA	0	-20.075	-20.075	20.075	0	0	0	-20.075	-20.075	-20.075	2021
877002	10052	Lukket	"Køb af B-3953 ""Forfatningskommissionen""	0	-6.995	-6.995	6.995	0	0	0	-6.995	-6.995	-6.995	2021
877003	29106	Lukket	Vestnorden Foresight 2030 - Fondsmidler	0		0		0		0		0		2021
877208	31021	Lukket	Reinvestering, 2008	0		0		0		0		0		2021
877210	30005	Lukket	Personaleboliger i Nuuk	0		0		0		0		0		2021
877210	30012	Igangværende	Personaleboliger i Nuuk	9.650	3.500	13.150	-20	13.130	22.000	-8.870	-13.099	-4.229	8.901	2021
877211	32003	Lukket	12 boliger afs. 3, Nanortalik	0		0		0		0		0		2021
877213	97015	Lukket	Renovering B-500 & B-700, Ilu.	0		0		0		0		0		2021
877213	97085	Lukket	Renovering B-294, B-295	0	-9.454	-9.454	9.454	0	0	0	-9.454	-9.454	-9.454	2021
877213	97150	Lukket	Renovering diverse steder, 2009	-4	-18.432	-18.436	18.436	0	0	0	-15.926	-15.926	-15.926	2021
877213	97151	Lukket	Renovering diverse steder, 2010	0	-3.337	-3.337	3.337	0	0	0	-3.337	-3.337	-3.337	2021
877213	97157	Igangværende	Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	82		82	-3	79	11.000	-10.921	-11.285	-365	-285	2021
877221	32066	Til intern revision	Støttet kom. udl.byggeri, 2006	0		0		0	21.366	-21.366	-21.366	0	0	2021
877221	32067	Lukket	Støttet kom. udl.byggeri, 2007	-1	-36.573	-36.574	36.574	0	0	0	-36.574	-36.574	-36.574	2021
877221	32068	Lukket	Støttet kom.	0	-44.513	-44.513	44.513	0	0	0	-44.513	-44.513	-44.513	2021

			udl.byggeri, 2008											
877221	32090	Igangværende	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	-1.555		-1.555		-1.555	69.800	-71.355	-71.355	0	-1.555	2021
877222	35018	Lukket	Boligprg.f/bygder og yderd. 2009	0		0		0		0		0		2021
877222	35019	Lukket	Boligprg.f/bygder og yderd. 2010	0		0		0		0		0		2021
877222	35024	Lukket	Boligprg.f/bygder og yderd. 2014	0		0		0		0	-22.787	-22.787	-22.787	2021
877222	35025	Til intern revision	Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	-707		-707		-707	8.400	-9.107	-9.131	-22	-731	2021
877222	36106	Til intern revision	Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	-153		-153		-153	2.480	-2.633	-2.473	160	7	2021
877222	39039	Igangværende	Aktivitetshus til Kullorsuaq	3.500		3.500		3.500	3.500				3.500	2021
877225	92002	Lukket	Sanering af blok Q, R og S, Nuuk og privat nybygge	0		0		0		0		0		2021
877225	92003	Lukket	Sanering af boligblokke, Paamiut	0		0		0		0		0		2021
877310	24111	Igangværende	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	2.737		2.737		2.737	8.700	-5.963	-8.707	-2.745	-7	2021
877310	24112	Til intern revision	Sektorplan for havne, 2015	2.043		2.043		2.043	2.500	-457	-458	0	2.042	2021
877312	24116	Igangværende	Reinvestering i havne og kajanlæg	3.413	25.200	28.613	-10.621	17.994	169.869	-154.253	-160.381	-6.127	9.488	2021
877312	24122	Igangværende	Sektorplaner for havne	3.600		3.600		3.600	3.700	-100	-104	-4	3.596	2021
877312	24128	Igangværende	Diverse nyanlæg	1.318	20.000	21.318		21.318	21.522	-204	-204	0	21.318	2021
877312	24129	Igangværende	Havn i Kangerlussuaq	3.894		3.894	-260	3.634	4.000	-366	-359	7	3.641	2021
877312	24130	Til intern revision	Læmole i Qaanaaq	-90		-90	-846	-936	33.000	-33.936	-33.813	123	-813	2021
877312	24131	Igangværende	Havnefaciliteter i Uummanaq	12.317		12.317	-7.874	4.443	34.100	-29.657	-32.084	-2.428	2.016	2021
877312	24136	Igangværende	Etablering af anløbsfaciliteter	3.483		3.483	-337	3.145	4.150	-1.005	-1.005	0	3.145	2021
877320	25174	Lukket	Paamiut Lufthavn	0		0		0		0		0		2021
877320	25184	Lukket	Lufthavn ved Qaqortoq	0		0		0		0		0		2021

877320	25194	Lukket	Tasiilaq	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-5	-5	-5	2021
877320	25195	Lukket	Ittoqqortoormiit	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-5	-5	-5	2021
877320	25196	Til intern revision	Qeqertarsuaq	1.483	-1.000	483		483	500	-17	-11	6	489	2021
877320	25197	Lukket	Kangaatsiaq	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-11	-11	-11	2021
877320	25198	Lukket	Qasigiannuguit	1.483	-1.500	-17	17	0	0	0	-11	-11	-11	2021
877320	25199	Lukket	Narsaq	991	-1.000	-9	9	0	0	0	-3	-3	-3	2021
877320	25200	Til intern revision	Nanortalik	985	-1.000	-15		-15	0	-15	-9	6	-9	2021
877320	25201	Igangværende	Kangerlussuaq	999		999	-150	849	1.000	-151	-151	0	849	2021
877320	25204	Igangværende	Uummannaq, landingsbane	994	-1.000	-6		-6	0	-6	-6	0	-6	2021
877322	20039	Lukket	Lovliggørelse af elforsyning	0	-5.775	-5.775	5.775	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	2021
877322	25038	Til intern revision	Radiofyur, renovering	828		828		828		828		-828		2021
877322	25158	Lukket	Banerenovering, Ilulissat	0		0		0		0		0		2021
877322	25182	Igangværende	Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	-387		-387	-367	-754	24.957	-25.711	-25.711	0	-754	2021
877322	25183	Igangværende	Langsigtede investeringsbehov	2.698	10.000	12.698	-3.168	9.531	40.000	-30.469	-30.436	33	9.564	2021
877322	25186	Lukket	Udbedring skimmelsvamp angreb, Sisimiut	0	-1.710	-1.710	1.710	0	0	0		0	0	2021
877322	25188	Til intern revision	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	-49		-49		-49	18.100	-18.149	-18.149	0	-49	2021
877322	25190	Igangværende	Rullende materiel	0		0		0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	2021
877322	25191	Lukket	Tilstandsregistrering af heliportbygninger	-14	-100	-114	114	0	0	0	-114	-114	-114	2021
877322	25193	Igangværende	Vej til lufthavn i Qaanaaq	1.200		1.200		1.200	4.500	-3.300	-4.097	-797	403	2021
877322	25203	Lukket	Sikkerhedsudstyr til lufthavne	11	-10.200	-10.189	10.189	0	0	0	-18.745	-18.745	-18.745	2021
877322	25206	Igangværende	Rullende materiel	9.984		9.984	-10.289	-305	11.100	-11.405	-11.100	305	0	2021
877322	25207	Til intern	Helikopterflyvepladser	-251		-251	-1	-252	5.000	-5.252	-5.251	1	-251	2021

		revision												
877322	25208	Igangværende	Vejrobservationstjeneste til lufthavne	2.909		2.909	-1.017	1.893	3.900	-2.007	-1.779	229	2.121	2021
877322	25212	Igangværende	Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	-904		-904	939	34	5.900	-5.866	-5.900	-34	0	2021
877322	25213	Igangværende	Hangar til helikopter	9.130		9.130	-7.109	2.021	26.000	-23.979	-26.000	-2.021	0	2021
877322	25214	Igangværende	Hangar til Tasiilaq		29.300	29.300	-7.432	21.868	29.300	-7.432	-29.300	-21.868	0	2021
877322	25938	Lukket	TD:Radiofyr, renovering	-18	-6.500	-6.518	6.518	0	0	0	-6.518	-6.518	-6.518	2021
877501	61003	Igangværende	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	41.833		41.833	-44.073	-2.239	220.000	-222.239	-123.539	98.700	96.461	2021
877502	74002	Lukket	Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas	1	13.742	13.743	-13.743	0	0	0	13.743	13.743	13.743	2021
877503	74005	Til intern revision	Tilskud til kommunale miljøanlæg	2.438		2.438		2.438	44.500	-42.062	-44.405	-2.343	95	2021
897140	15001	Lukket	Vandkraftværk, Qorlortorsuaq	0		0		0		0		0		2021
897140	17772	FFL (ikke aktiv)	Vandbehandlingsanlæg	0		0		0	12.600	-12.600	-12.600	0	0	2021
897140	17773	Lukket	Udlån til Nukissiorfiit, 2016	0	-7.400	-7.400	7.400	0	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	2021
897140	17774	Lukket	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	2021
897140	17775	Lukket	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	0	-78.400	-78.400	78.400	0	0	0	-78.400	-78.400	-78.400	2021
897140	17776	Lukket	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	2021
897140	17778	Igangværende	Udlån til Nukissiorfiit, 2021		60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000		60.000	60.000	2021
897140	21077	Lukket	Etabl. af vandkraftværk i Kulusuk	0	-18.100	-18.100	18.100	0	0	0	-18.100	-18.100	-18.100	2021
897141	28028	FFL (ikke aktiv)	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2013	0		0		0	6.500	-6.500	-6.500	0	0	2021
897141	28029	Lukket	Særlige byggemodning i Qinngorput	0	-95.400	-95.400	95.400	0	0	0		0	0	2021
897212	30014	Til intern revision	Alsidge boliger 2015, Qaqortoq	-151		-151		-151	27.800	-27.951	-27.951	0	-151	2021

897212	30015	Til intern revision	Alsidge boliger 2015, Maniitsoq	-220		-220	-519	-739	46.600	-47.339	-47.364	-25	-764	2021
897212	30017	Igangværende	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	2.043	3.000	5.043	-996	4.046	79.710	-75.664	-77.166	-1.501	2.544	2021
897212	30019	Igangværende	Funktionelle boliger, Ilulissat	10.405	20.000	30.405	-21.169	9.238	48.000	-38.762	-58.443	-19.680	-10.443	2021
897212	30025	Igangværende	Nye boliger 2019, Qaqortoq	-385	15.000	14.615	-10.946	3.668	23.300	-19.632	-27.870	-8.238	-4.570	2021
897212	30026	Igangværende	Nye boliger 2019, Aasiaat	678	23.500	24.178	-6.197	17.981	25.100	-7.119	-50.972	-43.854	-25.872	2021
897212	30028	Igangværende	Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	499		499	-16	483	1.200	-717	-712	5	488	2021
897212	31028	Lukket	Skimmelsvamps renovering	0		0		0		0		0		2021
897212	31029	Til intern revision	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	3.611		3.611	-2.758	853	40.000	-39.147	-39.147	0	853	2021
897212	31030	Igangværende	Diverse nedrivning Qaqortoq	12.134	2.000	14.134	-9.259	4.875	22.300	-17.440	-20.793	-3.353	1.507	2021
897212	31031	Igangværende	Diverse nedrivning Narsaq	5.318		5.318	-108	5.210	16.000	-10.791	-10.909	-117	5.091	2021
897212	31032	Igangværende	Diverse nedrivning Paamiut	8.933	4.500	13.433	-481	12.951	29.500	-16.549	-16.256	292	13.244	2021
897212	31033	Igangværende	Diverse nedrivning Nuuk	123		123		123	12.300	-12.177	-12.183	-7	117	2021
897212	31034	Igangværende	Diverse nedrivning Maniitsoq	4.170		4.170	-822	3.348	16.500	-13.502	-13.552	-50	2.948	2021
897212	31035	Igangværende	Diverse nedrivning Sisimiut	3.186		3.186	117	3.303	10.000	-6.697	-7.739	-1.042	2.261	2021
897212	31036	Igangværende	Diverse nedrivning Aasiaat	1.018	3.000	4.018	-441	3.577	5.794	-2.708	-4.372	-1.665	1.422	2021
897212	31037	Igangværende	Skimmel renovering	15.373	4.500	19.873	-16.465	3.408	53.700	-50.527	-51.684	-1.160	2.016	2021
897212	31040	Igangværende	Diverse nedrivning Nanortalik	771		771		771	3.500	-2.729	-2.850	-121	650	2021
897212	31042	Igangværende	Diverse nedrivning Qasigiannuguit	3.401		3.401	-13	3.388	7.000	-3.612	-3.636	-24	3.364	2021
897212	31043	Igangværende	Landsdækkende skimmelrenovering	7.052	1.500	8.552	-4.089	4.464	31.000	-26.645	-27.546	-907	3.454	2021
897212	31045	Igangværende	Diverse nedrivning Ilulissat	1.698	1.200	2.898		2.898	2.900	-2	-2	0	2.898	2021
897212	31046	Til intern revision	Renovering af boliger, Aasiaat	-177		-177		-177	12.706	-12.883	-12.883	0	-177	2021

897212	31048	Igangværende	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	18.919	-13.700	5.219	-3.330	1.889	82.400	-80.511	-81.562	-1.050	838	2021
897212	31049	Igangværende	Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	609		609	168	777	11.100	-10.323	-10.026	299	1.074	2021
897212	31050	Igangværende	Renovering af altaner, Qaqortoq	12.899		12.899	-6.706	6.193	16.700	-10.507	-14.630	-4.123	2.070	2021
897212	31051	Igangværende	Renovering af altaner, Paamiut	7.943		7.943	-3.809	4.134	11.400	-7.266	-10.013	-2.747	1.387	2021
897212	31053	Igangværende	Renovering af altaner, Maniitsoq	15.827		15.827	-11.367	4.460	19.800	-15.340	-17.066	-1.725	2.734	2021
897212	31055	Igangværende	Renovering af altaner, Sisimiut	14.224		14.224	-7.876	6.348	15.000	-8.652	-11.923	-3.271	3.077	2021
897212	31058	Igangværende	Skimmel renovering, Qaqortoq	2.000	2.000	4.000	-2.871	1.129	4.000	-2.871	-3.429	-558	571	2021
897212	31059	Igangværende	Skimmel renovering, Maniitsoq	2.000	2.000	4.000		4.000	4.000				4.000	2021
897212	31060	Igangværende	Skimmel renovering, Sisimiut	5.000	3.000	8.000	-15	7.985	8.000	-15	-15	0	7.985	2021
897212	31062	Igangværende	Skimmel renovering, Aasiaat	1.500	-1.500	0		0	0				0	2021
897212	31063	Igangværende	Skimmel renovering, Ilulissat	2.000	1.500	3.500		3.500	3.500				3.500	2021
897212	31064	Igangværende	Nedrivning af BSU-huse	8.157		8.157	-872	7.285	8.200	-915	-576	339	7.624	2021
897212	31065	Igangværende	Renovering af Eqalugalinnguit, Nuuk	12.839	3.500	16.339	-9.959	6.380	16.400	-10.685	-14.428	-3.743	1.972	2021
897212	31066	Igangværende	Fornyelse af installationer i flere byer	45.200		45.200	-8.417	36.783	45.200	-9.551	-10.070	-519	35.130	2021
897212	32124	Igangværende	Boliger	14.171	-7.800	6.371	-1.624	4.749	29.540	-24.791	-27.585	-2.794	1.955	2021
897212	32125	Lukket	16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014	0	-12.800	-12.800	12.800	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	2021
897212	32126	Lukket	16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014	-17	-12.800	-12.817	12.817	0	0	0	-12.817	-12.817	-12.817	2021
897212	32127	Til intern revision	12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	-366		-366		-366	7.900	-8.266	-8.266	0	-366	2021

897212	32128	Til intern revision	12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	-678		-678		-678	7.900	-8.578	-8.578	0	-678	2021
897212	32129	Igangværende	Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	12.033		12.033		12.033	26.700	-14.667	-26.712	-12.045	-12	2021
897212	32131	Lukket	8 boliger, Qaanaaq 2014	38	-11.750	-11.712	11.712	0	0	0	-12.016	-12.016	-12.016	2021
897212	32132	Lukket	12 boliger, Aasiaat 2014	0		0		0		0	-13.000	-13.000	-13.000	2021
897212	32133	Igangværende	24 boliger, Ilulissat 2014	17.922		17.922		17.922	18.000	-78	-105	-27	17.895	2021
897212	32134	Til intern revision	4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	-4		-4	-160	-163	20.566	-20.729	-21.933	-1.202	-1.367	2021
897212	32137	Lukket	Projektering af ældrevenlige boliger	-3		-3	3	0		0	-3	-3	-3	2021
897212	32139	Lukket	Tilskud til renovering og sanering af boliger	0	-4.000	-4.000	4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	2021
897212	32140	Igangværende	Ungdomsboliger - typehus	2.300		2.300	-1.645	655	2.300	-1.645	-2.005	-361	295	2021
897212	32141	Igangværende	Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	14.533	1.500	16.033	-4.825	11.208	16.100	-4.892	-17.580	-12.688	-1.480	2021
897212	34510	Lukket	300 boliger, Nuuk	0		0		0		0	-33.000	-33.000	-33.000	2021
897212	34513	Lukket	96 boliger, Innartalik, Nuuk	0		0		0		0	-126.082	-126.082	-126.082	2021
897212	34514	Lukket	Sanering af blok P	0		0		0		0		0		2021
897212	34515	Lukket	Erstatningsbyggeri for Blok P	0		0		0		0		0		2021
897212	34517	Lukket	Byhuse	1	-144.002	-144.001	144.001	0	0	0	-144.001	-144.001	-144.001	2021
897212	34518	Lukket	Radiofjeldet, nybyggeri	0		0		0		0		0		2021
897212	34519	Lukket	84 boliger Pisissia, Nuuk	0		0		0		0	-62.380	-62.380	-62.380	2021
897212	34522	Lukket	Boliger i Pisissia, byggefelt 8	0		0		0		0		0		2021
897212	34525	Lukket	28 boliger ved Sarfarsuit	0		0		0		0		0		2021
897212	34526	Lukket	16 boliger ved Sarfaarsuit	0		0		0		0		0		2021
897212	34527	Igangværende	Diverse renovering og sanering	56.751	64.300	121.051	-35.791	85.261	314.055	-229.693	-260.858	-31.167	53.197	2021

897212	34528	Lukket	Genhusningcenter for lejere i Nuuk	0	-7.712	-7.712	7.712	0	0	0	-7.712	-7.712	-7.712	2021
897212	34534	Til intern revision	Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	-100		-100		-100		-100	-100	0	-100	2021
897212	36101	Til intern revision	Bygder- og yderdistrikter	-8		-8		-8	15.000	-15.008	-15.008	0	-8	2021
897212	38013	Lukket	Test Lab	0		0		0		0		0		2021
897212	38016	Lukket	Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer	100	-100	0		0	0				0	2021
897212	38017	Til intern revision	Udvikling af Illoq Nutaaq	-98		-98		-98	700	-798	-879	-81	-179	2021
897212	38018	Igangværende	Forundersøgelser i Qaanaaq	-154		-154		-154	2.600	-2.754	-2.754	0	-154	2021
897212	39034	Lukket	4 kommunale byggesæt, Kangerlussuaq 2014	0		0		0		0		0		2021
897212	39041	Igangværende	Genhusning efter oversvømmelse	-27.134		-27.134	-1.677	-28.812	81.554	-110.366	-110.500	-134	-28.946	2021
897212	39043	Igangværende	Opførelse af boliger, Qaarsut		23.100	23.100	-9.365	13.735	23.100	-9.365	-22.862	-13.497	238	2021
			Afrunding	-82			7	7						
			Periodisering				187	92						
Hovedtotal				1.078.022	-316.181	761.923	255.162	1.017.003	4.606.363	-3.602.007	-5.229.322	-1.697.226	-623.073	

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Kapitel 4

Finanslov, årsbudget m.v.

Anlæg, renovering m.v.

§ 14. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til projektering af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.

Stk. 2. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til udførelse af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.

§ 15. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres investeringer i fast ejendom, anlæg og andre aktiver.

Stk. 2. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres lånetilsagn til anlægs- og renoveringsopgaver.

Stk. 3. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres tilskud til anlægs- og renoveringsopgaver.

§ 16. Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om anvendelsen af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.

§ 17. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om overførsel af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger til senere finansår, når et mindre forbrug skyldes forsinkelser vedrørende en anlægs- eller renoveringsopgave
